

2020년도 문화재위원회

제2차 건축문화재분과위원회 회의록

- ▣ 회의일시 : 2020. 2. 20(목), 14:00 ~ 17:20
- ▣ 장 소 : 국립고궁박물관 회의실
- ▣ 출석위원 : 김봉렬, 김정희, 김창준, 윤균(오심), 이경미,
이정수, 임영애, 전봉희, 정명섭 (이상 9명)
- ▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

문 화 재 위 원 회

목 차

【심의사항】

1	경산 팔공산 관봉 석조여래좌상 주변 전통문화체험관 건립	공개
2	서산 용현리 마애여래삼존상 주변 공공하수처리장 건립	공개
3	청양 읍내리 석조여래삼존입상 주변 공동주택(고령자 복지주택) 신축(2차)	공개
4	성주 범수사지 삼층석탑 주변 숙박시설(본관) 증축(2차)	공개
5	성주 범수사지 삼층석탑 주변 숙박시설(별관) 증축(2차)	공개
6	양산 미타암 석조아미타여래입상 주변 간선임도 신설	공개
7	용인 서봉사지 현오국사탑비 주변 근린생활시설 및 단독주택 신축(변경허가)	공개
8	강릉향교 대성전 주변 공동주택 신축(변경허가 2차)	공개
9	밀양 영남루 주변 밀양신협 본점 신축	공개
10	영천 승렬당 주변 창고 신축	공개
11	고성 건봉사 능파교 주변 템플스테이 체험관 및 부대시설 건립(재심의)	공개
12	양평 용문사 정지국사탑 및 비 주변 부도전 이전(재심의)	공개
13	보성 별교 흥교 주변 제7주갑 기념비 제작·설치	공개
14	포항 보경사 원진국사비 주변 계류보전사업	공개

【검토사항】

15	장수향교 대성전 국가지정문화재(국보) 지정 검토	공개
16	완주 안심사 요사채(공양간) 개축공사 설계 검토(2차)	공개
17	장성 백양사 소요대사탑 이전 보호시설 개보수 검토	공개

【보고사항】

18	종묘 정전 보수정비 보고	공개
19	2020년도 문화재 재난안전 관리 사업 추진계획 보고	공개

20	2020년도 문화재보수정비 국고보조사업 추진계획 보고	공개
21	<p>국가지정문화재 현상변경 등 처리결과 보고</p> <ul style="list-style-type: none"> - 영천 신월리 삼층석탑 주변 진입로 개설공사 - 공주 마곡사 영산전 주변 단독주택 진입로 개설 - 안동 예안이씨 충효당, 안동 체화정 주변 하천제방 사면보강 공사 - 성주 범수사지 삼층석탑 주변 단독주택 신축(변경허가) - 영암 성풍사지 오층석탑 주변 단독주택 신축(변경허가) - 여주 신륵사 조사당 주변 노유자시설(근로복지시설(증축)) 및 가설 건축물(임시창고, 김치저장고) 설치 - 곡성 태안사 광자대사탑 주변 도로시설 (흙)포장 - 산청 단속사지 동 삼층석탑 주변 수목제거(변경허가) - 논산 쌍계사 대웅전 주변 임도, 숲길정비, 숲가꾸기 사업 - 대구 동화사 대웅전 주변 부도암 수선당 개축공사 - 부여 무량사 극락전 주변 수목정비 - 성주 금봉리 석조비로자나불좌상 주변 단독주택 신축 - 예산 수덕사 대웅전 주변 후원 증축(변경허가) - 부안 개암사 대웅전 주변 주차장 조성 - 제주 불탑사 오층석탑 주변 버섯재배시설 및 헨스 설치 - 공주 마곡사 대광보전 주변 기존 계단 철거 후 계단 설치(2차) - 보성 유신리 마애여래좌상 주변 종각 건립 - 홍성 신경리 마애여래입상 주변 임시공양간 설치 - 익산 고도리 석조여래입상 주변 주차장 부지 조성 	공개

【심의사항】

안건번호 건축 2020-02-001

1. 경산 팔공산 관봉 석조여래좌상 주변 전통문화체험관 건립

가. 제안사항

경북 경산시 소재 보물 「경산 팔공산 관봉 석조여래좌상」 주변에 전통문화 체험관을 건립하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 전통문화체험관을 건립하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “개별심의”에 해당됨.

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재 : 경산 팔공산 관봉 석조여래좌상

- 소재지 : 경북 경산시 와촌면 갓바위로81길 176-64, 선본사(대한리)
- 지정일 : 1965. 09. 01.

(3) 신청내용

- 사업위치 : 경북 경산시 와촌면 갓바위로 681-55
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 58m
- 사업내용 : 전통문화체험관 건립
 - 건축면적(연면적) : 319.68㎡(1,278.72㎡)
 - 층수/최고높이 : 지상4층 / 18.60m
 - 구조 : 철근콘크리트구조(1~3층), 한식목구조(4층)
 - 기존건물 철거(체험관/발우공양실, 전체 건축(연)면적 : 237.6㎡(762.3㎡))

- 건축(연)면적 : 216m²(719.1m²) / 21.6m²(43.2m²)
- 구조 : 철근콘크리트 / 철근콘크리트+한식목구조
- 층수 : 지상4층 / 지상2층
- 높이 : 17.8m / 8.7m
- ※ 철거 사유 : 자체 안전진단(체험관) 결과 D등급 판정

라. 의결사항

- 부결
 - 역사문화경관 저해 우려
 - 지형 조건 등을 충분히 고려한 배치와 건물 기능, 형태 등이 반영된 설계 필요
 - 관계전문가 자문 필요
- 의결정족사항
 - 출석 9명 / 부결 8명, 제척 1명

2. 서산 용현리 마애여래삼존상 주변 공공하수처리장 건립

가. 제안사항

충남 서산시 소재 국보 「서산 용현리 마애여래삼존상」 주변에 공공하수처리장을 건립하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 공공하수처리장을 건립하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제2구역 “평지붕 개별심의, 경사지붕 최고높이 7.5m 이하”에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재 : 서산 용현리 마애여래삼존상
 - 소재지 : 충남 서산시 운산면 용현리 2-10번지
 - 지정일 : 1962. 12. 20.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 충남 서산시 운산면 용현리 2-1번지
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 470m
 - 사업내용 : 공공하수처리장 건립
 - 대지면적 : 1,062㎡
 - 건축면적(연면적) : 141.46㎡(133.97㎡)
 - 층수/최고높이 : 지상1층 / 6.865m
 - 구조 : 철근콘크리트
 - 지붕형태 : 경사지붕

라. 의결사항

○ 조건부가결

- 관계전문가 자문을 받아 높이 축소 및 단순한 형태의 외관이 되도록 수정 함.

○ 의결정족사항

- 출석 9명 / 조건부가결 9명

3. 청양 읍내리 석조여래삼존입상 주변 공동주택(고령자 복지주택) 신축(2차)

가. 제안사항

충남 청양군 소재 보물 「청양 읍내리 석조여래삼존입상」 주변 공동주택 (고령자 복지주택)을 신축하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 공동주택(고령자 복지주택)을 신축하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제4구역 “국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리”에 해당됨(공통사항 : 전체 구역에서 층수가 10층 이상 건물은 개별심의).
- ※ ‘19년 문화재위원회 제12차 건축문화재분과 심의결과(2019.11.21.) : 보류
 - 역사문화 경관을 고려하여 높이 축소 후 검토
- ※ ‘19년 문화재위원회 제13차 건축문화재분과 심의결과(2019.12.19.) : 부결
 - 주변의 건물보다 높아 역사문화경관 저해

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 청양 읍내리 석조여래삼존입상
 - 소재지 : 충남 청양군 청양읍 칠갑산로9길 58(읍내리)
 - 지정일 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 충남 청양군 청양읍 교월리 114번지 일원
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 340m

○ 사업내용 : 공동주택(고령자 복지주택) 신축

구 분	1차 (‘19.11.21. / 보류)	보완 후 (‘19.12.19. / 부결)	금차	비 고
건축 면적 (연면적)	1,599.99㎡ (8,892,88㎡)	1,616.43㎡ (8,876.50㎡)	1,616.43㎡ (9,020.02㎡)	연면적 143.52㎡ 증가
구조	철근콘크리트구조	좌동	좌동	
동수	3개동	좌동	좌동	
층수	아파트 : 지하1층, 지상13~14층 부대복리 : 지하1층, 지상2층	아파트 : 지하1층, 지상13층 부대복리 : 지하1층, 지상2층	아파트 : 지하1층, 지상10층 부대복리 : 지하1층, 지상2층	3개층 감소
최고 높이	44.5m	41.7m	33.3m	8.4m 감소
세대수	120	좌동	좌동	

라. 의결사항

○ 조건부가결

- 관계전문가 자문을 받아 일부 입면 등을 조정한 후 시행

○ 의결정족사항

- 출석 9명 / 조건부가결 8명, 원안가결 1명

4. 성주 법수사지 삼층석탑 주변 숙박시설(본관) 증축(2차)

가. 제안사항

경북 성주군 소재 보물 「성주 법수사지 삼층석탑」 주변에 숙박시설(본관)을 증축하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 숙박시설(본관)을 증축하는 사항이 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “개별심의”에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 성주 법수사지 삼층석탑
 - 소재지 : 경북 성주군 수륜면 백운리 1215-1
 - 지정일 : 2010. 07. 05.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경북 성주군 수륜면 백운리 1282-4 외 2필지(1282-14, 1282-24)
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 약 200m

○ 사업내용

구분	호텔 본동					
	기존	허가현황 (증축)	실제 건축 현황	불법현황	증축 신청 (양성화)	최종합계
계(m ²)	6,235.12	1,492.95	2,626.20	+1,133.25	+476.7	8,204.77
지하(m ²)	2,275.77	-	-	-	-	2,275.77
지상1(m ²)	1,402.77	497.65	656.55	+158.9	+158.9	2,059.32
지상2(m ²)	1,278.29	497.65	656.55	+158.9	+158.9	1,934.84
지상3(m ²)	1,278.29	497.65	656.55	+158.9	+158.9	1,934.84
지상4(m ²)	-	-	656.55	+656.55	철거	-
높이(m)		14.8	19.616	+4.816 (19.616)	+2.513 (17.313)	17.313

라. 의결사항

- 부결
 - 역사문화경관 저해
- 의결정족사항
 - 출석 9명 / 부결 9명

5. 성주 법수사지 삼층석탑 주변 숙박시설 별관 증축(2차)

가. 제안사항

경북 성주군 소재 보물 「성주 법수사지 삼층석탑」 주변에 숙박시설 별관을 증축하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 숙박시설 별관을 증축하는 사항이 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “개별심의”에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 성주 법수사지 삼층석탑
 - 소재지 : 경북 성주군 수륜면 백운리 1215-1
 - 지정일 : 2010. 07. 05.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경북 성주군 수륜면 백운리 1282-2 외 3필지(1282-3, 1282-13, 1282-23)
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 약 200m

○ 사업내용

구분	호텔 별관 2동(철거 후 증축)					
	기존 (1동)	허가현황 (증축-2동)	실제 건축 현황	불법현황	증축 신청 (양성화)	최종합계
계(m ²)	561.03	2,437.42	3,098.47	+661.05	+135.09	3,133.54
지하(m ²)	53.07	894.28	890.22	-4.06	-4.06	943.29
지상1(m ²)	253.98	521.38	583.13	+61.75	+61.75	837.11
지상2(m ²)	253.98	510.88	574.33	+63.45	+63.45	828.31
지상3(m ²)	-	510.88	524.83	+13.95	+13.95	524.83
지상4(m ²)	-	-	525.96	+525.96	철거	-
높이(m)		15.7	19.445	+3.745 (19.445)	+2.565 (18.265)	18.265

라. 의결사항

- 부결
 - 역사문화경관 저해
- 의결정족사항
 - 출석 9명 / 부결 9명

6. 양산 미타암 석조아미타여래입상 주변 간선임도 신설

가. 제안사항

경남 양산시 소재 보물 「양산 미타암 석조아미타여래입상」 주변에 간선 임도를 신설하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 간선임도를 신설하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “개별심의”에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재 : 양산 미타암 석조아미타여래입상
 - 소재지 : 경남 양산시 주진로 379-61, 미타암
 - 지정일 : 1989. 04. 10.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경남 양산시 주진동 산101·산104·산97-2·산97-4·696-2, 소주동 산93
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 50m
 - 총사업비 : 552,400천원
 - * 산림청 국고보조사업 예산 확보 국비 40%, 지방비 60%
 - 사업목적 : 관람객을 위한 안전한 접근로 확보, 배수관리를 통한 산사태 예방 등
 - 사업내용 : 간선임도 신설
 - 길이/면적 : 0.83km/9,489m²
 - 도로폭 : 4m(유효폭 3m, 노견폭 0.5m×2)
 - 구매 : 최고 종단구매 18%, 평균 횡단구매 3~5%

- 토공
 - 토사절취 6,451.0m³/암석절취(연암) 1,198.0m³/암석절취(보통암) 513.0m³
 - 측구터파기 40.0m³/측구터파기(연암) 101.0m³ 등
- 구조물공
 - 큰돌찰쌓기 128.0m³/큰돌메쌓기 829.0m³/괘돌메쌓기 184.0m³
 - L형 용벽식 측구 30.0m 등
- 배수공
 - 파형강관 접합 및 부설 83.0m/배수관 구체다짐 177.2m³
 - ㄷ형 집수정 설치 5개소/ㄷ형강 개거 설치 8개소/토사 개거 24.0m
- 포장공
 - 콘크리트포장 : 콘크리트포장 포설 636.0m³, 자갈포설 318.0m³
 - 혼합골재포설 : 자갈포설 116.4m³
- 기타
 - 지장목 벌채 603본/임목파쇄 56.7m³
 - 가드레일 설치, 동물이동통로 설치, 사면 초류종자 살포 등

라. 의결사항

- 조건부가결
 - 관계전문가 자문을 받아 절성토량이 축소될 수 있도록 수정 필요
- 의결정족사항
 - 출석 9명 / 조건부가결 9명

7. 용인 서봉사지 현오국사탑비 주변 근린생활시설 및 단독주택 신축(변경허가)

가. 제안사항

경기 용인시 소재 보물 「용인 서봉사지 현오국사탑비」 주변에 근린생활 시설 및 단독주택을 신축하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가사항 변경 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 근린생활시설 및 단독주택을 신축하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “개별심의”, 제2구역 “평지붕 최고높이 11m, 경사지붕 최고높이 15m 이하”에 해당됨.
- ※ ‘19년 문화재위원회 제10차 건축문화재분과 심의결과(2019.10.19.) : 보류
 - 관계전문가 현지조사 후 재심의
- ※ ‘19년 문화재위원회 제12차 건축문화재분과 심의결과(2019.11.21.) : 원안가결

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 용인 서봉사지 현오국사탑비
 - 소재지 : 경기 용인시 수지구 신봉동 산11번지
 - 지정일 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경기 용인시 수지구 신봉동 746-1 외 2필지
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 415m

○ 사업내용 : 근린생활시설 및 단독주택 신축

구분	1차 (‘19.10.19./보류)	2차 (‘19.11.21./원안가결)	금차
사업부지면적	2,795m ²	좌동	좌동
건축면적 (연면적)	520.59m ² (1,633.49m ²)	518.93m ² (1,298.87m ²)	518.20m ² (1,266.84m ²)
층수 및 최고높이	지하1층, 지상2층 / 10.2m(평지붕)	지하1층, 지상2층 / 10.65m(평지붕)	지하1층, 지상2층 / 10.43m(평지붕)
건축구조	철근콘크리트조	좌동	좌동

※ 토지 현안측량 결과 원안가결(‘19.11.21)시 보다 절토 물량이 증가(5,115m³ →5,709m³, 증 594m³)하여 재심의 요청하는 사항임.(용인시 개발행위허가지침 변경(‘19.10월)에 따라 옹벽(3m*2단) 설치로 변경 반영)

라. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항
 - 출석 9명 / 원안가결 9명

8. 강릉향교 대성전 주변 공동주택 신축(변경허가 2차)

가. 제안사항

강원 강릉시 소재 보물 「강릉향교 대성전」 주변에 공동주택 신축하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가사항 변경허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변 공동주택 신축과 관련하여 변경허가 신청된 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제5구역 “강릉시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리”에 해당됨.(다만, 10층 이상 건물은 개별심의)
- ※ ‘18년 문화재위원회 제4차 건축문화재분과 심의결과(2018.04.19) : 보류
 - 현지조사 후 재심의
- ※ ‘18년 문화재위원회 제5차 건축문화재분과 심의결과(2018.05.17) : 부결
 - 진입부 역사문화경관 저해
- ※ ‘18년 문화재위원회 제6차 건축문화재분과 심의결과(2018.06.21) : 부결
 - 역사문화경관 저해(부결사유 개선 미흡)
- ※ ‘18년 문화재위원회 제8차 건축문화재분과 심의결과(2018.08.08) : 부결
 - 2차 부결 이후 개선사항 미흡
 - 소위원회에서 별도 검토 후 위원회에서 재심의
- ※ 소위원회 검토(2018.09.06.)
 - 전체 동의 스카이라인과 오픈공간 등을 고려하여 계획을 조정토록함이 좋겠음.
- ※ ‘18년 문화재위원회 제9차 건축문화재분과 심의결과(2018.09.20) : 가결
- ※ ‘20.01.09. 변경허가 신청
- ※ ‘20년 문화재위원회 제1차 건축문화재분과 심의결과(2020.01.16) : 부결
 - 역사문화경관 저해 우려(단지 스카이라인 및 오픈경관의 변화 등)

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 강릉향교 대성전
 - 소재지 : 강원 강릉시 명륜로 29
 - 지정일 : 1963. 01. 21.
- (3) 사업개요
 - 사업내용 : 공동주택 건립
 - 사업위치 : 강원 강릉시 교동 61-2번지 일원
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 346m
- (4) 변경사유 : 추가 부지 매입으로 일조권 등 확보를 위해 동별 층수 조정
- (5) 변경내용

구분	허가내용	변경내용(1차) (‘20.01.16 / 부결)	변경내용(2차)
대지면적	19,075㎡	19,892㎡	19,892㎡
건축면적	5,008.75㎡	4,073.84㎡	4,073.84㎡
연면적	67,063㎡	71,883.23㎡	71,745.14㎡
구조	철근콘크리트조	철근콘크리트조	철근콘크리트조
층수	지하3층, 지상22층	지하3층, 지상25층	지하3층, 지상25층
동별 최고 층수	101동 22층(97.70m) 102동 22층(97.70m) 103동 22층(97.70m) 104동 22층(97.70m) 105동 21층(83.90m/중간오픈) 106동 18층(75.50m/오픈) 107동 22층(86.70m/중간오픈) 108동 16층(69.90m) 109동 7층(55.70m)	101동 24층(101.03m) 102동 22층(97.70m) 103동 24층(103.03m) 104동 25층(100.50m) 105동 24층(90.30m/1층오픈) 106동 11층(53.90m/1층오픈) 107동 24층(90.30m/1층오픈) 108동 10층(51.10m/1층오픈) 109동 101동과 연결	101동 24층(101.03m) 102동 22층(97.70m) 103동 24층(103.03m) 104동 25층(100.50m) 105동 23층(87.50m/1층,중간오픈) 106동 12층(62.30m/1층오픈) 107동 23층(87.50m/1층,중간오픈) 108동 10층(51.10m/1층오픈) 109동 101동과 연결
세대수	460세대	461세대	461세대

라. 의결사항

- 조건부가결

- 관계전문가 자문을 받아 단지 스카이라인 조정 필요

- 의결정족사항

- 출석 9명 / 조건부가결 9명

9. 밀양 영남루 주변 밀양신협 본점 신축

가. 제안사항

경남 밀양시 소재 보물 「밀양 영남루」 주변에 밀양신협 본점을 신축하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 밀양신협 본점을 신축하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제3구역 “평지붕 최고높이 11m 이하”에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재 : 밀양 영남루
 - 소재지 : 경남 밀양시 중앙로 324(내일동)
 - 지정일 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경남 밀양시 내일동 141-1, 143-1, 144, 145-1, 146
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 30m
 - 사업내용 : 밀양신협 본점 신축
 - 대지면적/건축면적 : 528.75㎡/381.65㎡
 - 연면적 : 896.10㎡ * 옥탑층 제외
 - 지상 1층 : 276.25㎡/객장, 영업장, 서고, 상담실, 금고 등
 - 지상 2층 : 350.80㎡/회의실, 체력단련실, 문서보관실 등
 - 지상 3층 : 269.05㎡/강당, 창고 등
 - 옥탑층 : 43.64㎡/물탱크실, 계단실

- 최대높이 : 17.30m(지상 3층)
- 구 조 : 철근콘크리트구조
- 기 타 : 주차대수 5대, 지상·옥상 조경면적 26.45m²

라. 의결사항

- 부결
 - 역사문화경관 저해 우려(높이 축소 등 필요)
- 의결정족사항
 - 출석 9명 / 부결 9명

10. 영천 송렬당 주변 창고 신축

가. 제안사항

경북 영천시 소재 보물 「영천 송렬당」 주변에 창고를 신축하고자 “국가 지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 창고를 신축하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제2구역 “평지붕 개별심의, 경사지붕 최고높이 7.5m 이하”에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 영천 송렬당
 - 소재지 : 경북 영천시 송렬당길1(성내동)
 - 지정일 : 1970. 07. 23.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경북 영천시 성내동 55-4
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 15m
 - 사업내용 : 창고 신축
 - 건축면적(연면적) : 455㎡
 - 규모/최고높이 : 지상1층 / 10.5m
 - 구조 : 철골구조
 - 지붕형태 : 경사지붕
 - 벽체 : 경량 패널 마감

라. 의결사항

- 부결
 - 문화재 진입부 역사문화 경관 저해
- 의결정족사항
 - 출석 9명 / 부결 9명

11. 고성 건봉사 능파교 주변 템플스테이 체험관 및 부대시설 건립(재심의)

가. 제안사항

강원 고성군 소재 보물 「고성 건봉사 능파교」 주변 템플스테이 체험관 및 부대시설을 건립하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 템플스테이 체험관 및 부대시설을 건립하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 천연기념물 ‘향로봉·건봉산천연보호구역’ 지정구역 및 보물 ‘고성 건봉사 능파교’ 보호구역에 해당됨.
- ※ ‘19년 문화재위원회 제12차 건축문화재분과 심의결과(2019.11.21.) : 보류
 - 관계전문가(지도위원회) 현지조사 및 자문을 받아 수정·보완된 도면 재검토

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 고성 건봉사 능파교
 - 소재지 : 강원 고성군 거진읍 건봉사로 723
 - 지정일 : 2002. 02. 06.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 강원 고성군 거진읍 냉천리 32-1, 36, 37
 - 문화재와 이격거리 : 지정구역 및 보호구역 내
 - 사업내용 : 템플스테이 체험관 및 부대시설 건립
 - 1) 템플스테이 체험관
 - 면적 / 높이 : 707.83㎡(214.12평) / 11.5m
 - 지상 1층 : 209.88㎡(63.49평), 한식목조, 5량가, 팔작지붕, ‘ㄱ’자 평면

- 지하 1층 : 454.41m²(137.46평), 철근콘크리트조
- 지하 2층 : 43.54m²(13.18평), 소방용 저수조
- 용도 : 법당, 공양실, 숙소, 편의시설 등
- 2) 휴게시설
 - 면적 / 높이 : 51.48m²(15.58평) / 4.8m
 - 구조 / 양식 : 한식목조 / 굴도리집, 3량가, 맞배지붕, ‘ㄱ’자 평면
- 3) 화장실
 - 면적 / 높이 : 18.00m²(5.45평) / 4.95m
 - 구조 / 높이 : 한식목조 / 굴도리집, 3량가, 맞배지붕, ‘一’자 평면
- 4) 자비원
 - 면적 / 높이 : 98.82m²(29.89평) / 5.45m
 - 구조 / 높이 : 한식목조 / 납도리집, 5량가, 맞배지붕, ‘一’자 평면

라. 현지조사의견(2020.01.08. / 문화재위원 ○○○·○○○, 전문위원 ○○○·○○○)

- 휴게시설은 사찰과 계곡의 전경을 가리지 않도록 기념관 측면으로 위치를 조정하고 형태를 조정하며, 높이를 최대한 낮추는 것이 좋겠음.
- 자비원은 기존 경관저해 건물을 철거하고 신축하며, 탐방객의 편의상 필요한 것으로 판단됨. 다만 측면 진입부 입면은 조정이 필요한 것으로 판단됨.
- 화장실은 탐방객의 편의상 필요하나, 부지위치가 사역의 위쪽에 있어 적절치 않은 것으로 판단됨. 그러나 주변의 유구 등을 고려할 때, 대체부지 선정이 어려우므로 계획 부지에서 지반을 낮추고 배치를 조정하여 높이를 최대한 낮추는 것이 좋겠음.
- 템플스테이는 중심사역에서 산능선에 가려 보이지 않아 문화재 주변 경관에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 판단됨. 다만 건물의 형태는 사찰 건축임을 고려하여 조정이 필요할 것으로 판단됨.

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 템플스테이 체험관은 관계전문가 자문을 받아 추가 반영한 후 시행

○ 의결정족사항

- 출석 9명 / 조건부가결 9명

[참고]

구분	현지조사 자문내용	반영내용
템플스테이 체험관	건물 형태 조정 필요	지반 높이 1.8m 낮춤
휴게시설	위치 및 높이 조정 필요	위치 변경(기념관 측면), 면적 축소(61.38→51.48㎡)
화장실	배치 및 지반 높이 조정	
자비원	측면 진입부 입면 조정	

12. 양평 용문사 정지국사탑 및 비 주변 부도전 이전(재심의)

가. 제안사항

경기 양평군 소재 보물 「양평 용문사 정지국사탑 및 비」 주변에 부도전 이전을 위해 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 부도전 이전에 따른 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “개별심의”에 해당됨.
- ※ ‘20년 문화재위원회 제1차 건축문화재분과 심의결과(2020.01.16) : 보류
 - 관계전문가 현지조사 후 재심의

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 양평 용문사 정지국사탑 및 비
 - 소재지 : 경기 양평군 용문면 신점리 626번지 외 1필지
 - 지정일 : 1971. 07. 07.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경기 양평군 용문면 신점리 산99-6번지
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 51.1m
 - 총사업비 : 200백만원(자부담)
 - 사업내용 : 부도전 이전
 - 대지면적 : 당초 410㎡ ⇒ 변경 283㎡
 - 토석담장(H=1.2m) : 67m ⇒ 삭제

- 석축쌓기(H=0.5~2.7m) : 당초 65m ⇒ 변경 25m
- 토수로(D=300mm) 설치 : 당초 65m ⇒ 변경 34m
- 기타 : 당초 절토량 5.1m³, 성토량 14.9m³ ⇒ 변경 절토량 2.8m³, 성토량 3.7m³

라. 현지조사의견(2020.02.06. / 문화재위원 ○○○·○○○, 전문위원 ○○○)

- 기존 부도전은 부도의 훼손 우려가 있어 이전은 타당한 것으로 판단됨.
- 다만, 신청부지는 지형훼손을 최소화할 수 있도록 배치를 조정하고, 터파기 시 입회가 필요할 것으로 판단됨.
- 또한, 사적비는 이전에서 제외토록 함이 좋겠음.

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 사적비는 이전 대상에서 제외
 - 입구부에는 부도전 관리를 위한 최소한의 담장 설치
- 의결정족사항
 - 출석 9명 / 조건부가결 9명

13. 보성 벌교 홍교 주변 제7주갑 기념비 제작·설치

가. 제안사항

전남 보성군 소재 보물 「보성 벌교 홍교」 주변에 제7주갑 기념비 제작·설치를 위해 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 제7주갑 기념비 제작·설치에 따른 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “개별심의”에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 보성 벌교 홍교
 - 소재지 : 전남 보성군 벌교읍 벌교리 155-1번지
 - 지정일 : 2017. 08. 14.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 전남 보성군 벌교읍 벌교리 155-1번지
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 5m
 - 사업내용 : 기념비(2300*1100*500) 제작
 - 비신(금산석) : 1800*800*300
 - ※ 앞면 : 홍교 7주갑 비문(900여자)
 - 후면 : 추진위원, 후원자 명단(350여자)
 - 개석 : 300*1000*400
 - 대석 : 200*1100*500

라. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항
 - 출석 9명 / 원안가결 9명

14. 포항 보경사 원진국사비 주변 계류보전사업

가. 제안사항

경북 포항시 소재 보물 「포항 보경사 원진국사비」 주변에 계류보전사업을 하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의 하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 계류보전사업을 하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
- 현상변경 허용기준 제1구역 “개별심의”에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재 : 포항 보경사 원진국사비
 - 소재지 : 경북 포항시 북구 송라면 보경로 523, 보경사(중산리)
 - 지정일 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경북 포항시 북구 송라면 중산리 산101-1
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 60m
 - 사업내용 : 계류보전사업(현지조사 의견을 반영하여 신청)
 - 토공 : 토사절취(1,485m³), 암절취(236m³), 성토(204m³), 토사터파기(78m³), 암터파기(201m³), 잔토처리(1,463m³)
 - 자연석석축 : L=129.0m, H=1.0~1.5m(4~5단)
 - 구조물공 : PC암거 설치(B=2.0m, H=1.5m, L=14.0m), 돌골막이1(3개소), 돌골막이2(5개소), 돌골막이3(1개소), 계간수로(129.0m), 콘크리트수로(5.0m)

라. 현지조사의견(2020.02.04. / 문화재위원 ○○○, 전문위원 ○○○)

- 본 사업은 2019년 태풍 미탁에 의해 수해피해를 입은 지역에 대한 계류보전 사업으로 보경사의 수해피해 방지를 위해 필요한 것으로 판단됨.
- 다만, 사찰 인근의 구조물 설치사업임을 고려하여 석축 쌓기 방식을 사찰 주변 경관에 어울리도록 설치하는 것이 좋겠음.

마. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항
 - 출석 9명 / 원안가결 9명

【검토사항】

안건번호 건축 2020-02-015

15. 장수향교 대성전 국가지정문화재(국보) 지정 검토

가. 제안사항

전북 장수군 소재 「장수향교 대성전」에 대한 국가지정문화재(국보) 지정 신청 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 전북 장수군 소재 「장수향교 대성전」을 국가지정문화재(국보)로 지정 신청한 사항에 대하여 검토 받고자 하는 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 전라북도지사
- (2) 대상문화재 : 보물 제272호 「장수향교 대성전」
 - 소재지 : 전북 장수군 장수읍 향교길 31-15(장수리)
 - 지정일 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용 : 국가지정문화재(국보) 지정 신청
 - 명칭 : 장수향교 대성전(長水鄉校 大成殿)
 - 소유자(관리자) : 향교재단
 - 소재지 : 전북 장수군 장수읍 향교길 31-15(장수리)
 - 조성연대 : 조선시대
 - 지정면적 : 170.2m²(보호구역 1,849.8m²)
 - 수량 : 1동
 - 구조/형식 : 목구조/ 정면3칸, 측면3칸, 주심포, 맞배지붕

라. 현지조사의견(2019.07.03. / 문화재위원 ○○○·○○○·○○○)

- 문화재위원 ○○○ : 국가지정문화재(국보) 지정가치 미흡.
- 문화재위원 ○○○ : 국가지정문화재(국보) 지정가치 미흡.
- 문화재위원 ○○○ : 국가지정문화재(국보) 지정가치 미흡.

마. 지정조사보고서 : [붙임] 참조

바. 의결사항

- 부결
 - 지정가치 미흡
- 의결정족사항
 - 출석 9명 / 조건부가결 9명

[붙임] 국가지정문화재(국보) 지정조사보고서

■ 문화재보호법 시행규칙 [별지 제4호서식] <개정 2016.2.29.>

(앞쪽)

국가지정문화재 등의 지정조사보고서

조사일	2019. 7. 3.	대상문화재	장수 향교 대성전 (보물 제272호)		
조사자	성명	○○○	전공 분야	한국건축사	
	소속		직위(직책)		
주요 지정 사항 검토	문화재 종류	국가지정문화재(국보)			
	문화재 명칭	장수향교 대성전			
	입지 현황 및 역사문화환경	세부내용 별첨 참조			
	연혁·유래 및 특징	세부내용 별첨 참조			
	지정 가치 및 근거기준	세부내용 별첨 참조			
	지정 대상 및 범위	<해당 문화재(문화재구역)>			
		<보호물>			
<보호구역>					
보호 관리 사항 검토	문화재 보존 영향 행위기준 (안)				
	보존정비 및 활용 착안사항				
종합의견					

위와 같이 「문화재보호법 시행령」 제11조제3항 및 제13조제3항과 같은 법 시행규칙 제8조에 따라 국가지정문화재 등의 지정조사보고서를 제출합니다.

2020 년 1 월 일

제출자

(서명 또는 인)

문화재청장 귀하

1. 조 사 자 : ○○○, 한국건축사
2. 신청종별 : 국보
3. 문화재명칭 : 장수향교 대성전(長水鄉校 大成殿)
4. 소재지 : 장수군 장수읍 향교길 31-14
5. 연 혁 :

장수향교¹⁾는 1407년(태종 7) 인근의 선창리 당곡(先昌里 堂谷)²⁾에 문묘를 처음 건립하였다. 1422년에 명륜당과 동·서재가 건립되고, 1456년(세조 2)에 문묘가 대성전으로 명칭이 바뀌었다. 1587년(선조 30) 정유재란 때 왜적으로부터 병화를 면한 후 1681년(숙종 7) 유림 한유일(韓有一)로 하여금 이건설(移建狀)을 조정에 올리도록 하여 윤허를 받았다. 이건은 1685년(숙종 11) 착수하여 1686년 지금 자리에 대성전을 비롯한 명륜당·동재·서재 등을 모두 옮겼다. 1691년(숙종 17) 장수향교이전사적비(長水鄉校移轉事蹟碑), 1846년(헌종 12) 정경손비(丁敬孫碑)를 세우고 그 후 1877년 중수를 비롯하여 여러 차례 수리가 이루어져 오늘에 이른다. 홍살문은 1987년에 신설, 관리사는 1990년에 개축, 유림회관(충효당)은 1998년에 신축, 사마재는 2000년에 신축(복원) 하였다.

6. 입지 현황 및 역사문화환경 :

장수향교는 덕유산 산줄기가 뺨어 내린 동쪽 장안산과 서쪽 팔공산으로 둘러싸인 곳에 위치하고 있다. 대지는 뒤편 야산을 등진 산자락 끝으로 평지에 가까운 약한 완경사지다.

남서쪽에 장수군청이 있고 그 남쪽의 의암호와 의암공원 우측에 의암사(義巖祠)³⁾가 있다. 동편으로 약10여km 정도 떨어진 대곡리 주촌마을에는 의암 주논개의 생가지가 있는데, 1996년부터 2000년까지 5년에 걸쳐 조성한 논개 기념관, 단아정(丹娥亭), 의랑루(義娘樓) 등의 건물과 주논개생장사적비, 최경회현감선덕비, 주논개 부모묘, 논개정려비각 등이 있다.

7. 건축현황 및 특징 :

배치는 세 영역으로 구분되어 남서향으로 앉아있다. 맨 앞쪽에 홍살문을 들어서면 마당 우측에 관리사와 유림회관(충효당)이, 외삼문(扶綱門) 쪽에 정충복비각(丁忠僕碑閣)이 부속 지원공간을 이루고 있다. 지원공간 뒤편은 강학공간으로 외삼문을 들어서면 명륜당⁴⁾을 앞에 두고 그 뒤쪽 마당 좌·우에 각기 동재(敬誠

1) 보물 제272호

2) 현재 창계서원(滄溪書院)의 맞은 편 음지선창지역으로 추정.

3) 전라북도 기념물 제46호, 임진왜란 때 순국한 의암 주논개의 초상화를 모시고 제사를 지내는 사당.

齋)·서재(進德齋)를 배치하였으며, 서재 뒤편 대성전 서쪽 담장 밖에 사마재를 두었다. 맨 뒤편에 자리한 제향공간은 대성전과 내삼문이 별도로 반듯한 장방형의 일곽을 이루고 있다. 동재와 서재가 대향하지 않고 명륜당이 대성전 축선에서 다소 벗어나있는 것은 전형적인 강학공간의 배치와는 다른 점이다.

향교의 배치유형은 일반적으로 평지형은 전묘후학, 경사지형은 전학후묘가 많이 나타나고 있다. 장수향교는 제향공간 자리가 약간 높지만 경사 정도가 미미하므로 평지형에 속한 것으로 볼 수 있다. 평지인 경우에 주류를 이루는 전묘후학이 아니고 전학후묘인 것은 17세기 후반 이건하기 이전의 창건 당시에 있었던 곳이 경사지형으로 그 때의 배치형식을 그대로 따랐기 때문으로 여겨진다. 강학공간은 전당후재형으로 호남지역에서 주로 많이 찾아 볼 수 있는 유형이다.

대성전 : 별도로 일곽을 이룬 정면의 솟을삼문을 들어서면 완만한 경사지에 큰 박석 마당을 두고 그 뒤편에 크게 자리 잡고 있다.

정면 3칸, 측면 3칸 규모로 전면에 전퇴를 두었다. 내부는 마루바닥으로 마감하고 공자와 4성, 송조 4현(주돈이, 정호, 정이, 주희), 우리나라 18현⁵⁾을 배향하고 있다. 향교 대성전의 바닥은 건립 당시 전돌 바닥이던 것을 후대에 마루바닥으로 교체하는 경향으로 볼 때 장수향교도 전돌 바닥이었을 가능성이 높다.⁶⁾ 기단은 전저후고의 지형에 따라 정면은 장대석 두벌대로 쌓고 뒤쪽으로 조금씩 낮추어 배면은 외벌대로 쌓았다. 초석은 정면의 외진주와 뒷간 내진주만 원형 정평초석으로 정면의 위계성을 높이고 나머지는 덩벙초석을 놓았다.

기둥은 모두 원주다. 두 칸 정도로 넓은 측면 중앙간의 세장한 기둥이 눈에 띄는데 그 형태가 특이하다. 퇴량 정도 높이까지는 원주이고 그 위는 방형부재가 이어져 대량을 받치고 있다. 대량 바닥면을 지지하는 부분의 미관을 고려하여 벽선처럼 원주를 치목 한 것으로 보이나 확인 할 수 없었다. 이 기둥은 구조적으로 불안정한 넓은 주간의 보조 기둥으로 후설 한 것이라 판단된다. 네 모서리 기둥에 까치발이 받쳐져있다. 기둥의 중앙쯤에서 휘어 오른 곡재가 창방과 통맞춤하여 그 위의 공포와 상부 부재를 받치고 있다. 이는 맞배지붕 양단의 뿔목이 점차적으로 처지는 근본적인 구조적 취약점을 보강하기 위한 것으로 판단된다. 정연하지 못한 결구 수법, 시각적으로 중요한 귀퉁이 공포와 의장적으로 어색함

4) 전라북도 문화재자료 제28호

5) 장수향교는 소설위(小說位)에 해당

6) 경주(12세기 초)·상주(13세기 후반)·나주향교(14세기 후반) 등에서 볼 수 있음.

경주향교는 현재 장마루이나 아래에 전돌 바닥이 그대로 남아 있다.

을 떨칠 수 없다. 이런 부자연스러운 점으로 미루어 볼 때 건립 당시부터 있었던 것으로 보기는 어렵다. 하지만 타 향교에서 찾아 볼 수 없는 유일함은 특이 점으로 볼 수 있겠다.

벽체는 회사벽으로 하고 정면에만 중방이하에 창호와 일부 판벽을 설치하여 실내 공간 분위기가 엄숙하다. 정면 창호는 정칸에는 쌍여단이굽널정자살 문, 협칸에는 외여단이굽널정자살 문과 판벽 위에 정자살 불박이창이 설치되어 있다. 정면 창호 구성은 비교적 시기를 올려 볼 수 있는 것으로 고창향교(高敞鄕校)와 금산향교(錦山鄕校)와 유사하다.⁷⁾

정면 공포는 외2출목 3익공계, 배면은 외1출목 이익공계로 정·배면의 구성이 다르다. 정면 공포는 3익공을 아래서부터 연화양서 두 개와 연봉수서로 꾸미고 그 위 양두를 봉두각으로 장식하고, 주간에는 화반을 두 개씩 놓았다. 배면 공포는 이익공을 연화양서와 연봉수서를 아래위로 두고 정면처럼 봉두각 장식하고, 주간에는 화반 대신 소로로 수장했다. 정면과 배면의 익공 촛가지 내부는 연화로 초각한 양봉이 보를 받치고 있다. 정면 공포의 전체적인 모양새가 전주 풍남문(全州 豐南門)⁸⁾ 2층 주심포와 유사성을 읽게 한다. 공포의 익공 촛가지와 양봉, 화반 등의 장식성이 비교적 강한 것으로 보아 이건(17세기 후반) 당시 모습으로 보기는 어렵다. 이러한 공포의 양식은 현재 보물로 지정된 향교들⁹⁾의 공포 형식보다 뛰어나지 못하다.

상부 가구는 2고주 7량 가로 내부에는 고주를 생략하고 대량 위에 판형동자주로 중보를 받게 하고, 중보 위에는 동자형동자주로 중보를 지지하게 했다. 중보 위에는 제형판대공이 종도리를 받고 있으며, 두 동자주와 대공에는 뜯장혀가 설치되어 있다.

천장은 종도리 사이의 중앙부를 우물천장으로 꾸며 특별히 위상을 높이고, 나머지는 연등천장으로 하였다. 다른 향교에서 볼 수 없는 독특한 구성으로 이처럼 중앙부를 강조한 천장은 나주 금성관에서도 찾아 볼 수 있다. 유교의 이념에 따라 장식적인 요소를 배제한 향교건축의 조형적 규범을 벗어날 뿐 아니라 천장

7) 고창향교 대성전 : 1605년 대수선, 전라북도 문화재자료 제98호, 금산향교 : 1684년 재건, 충청남도 기념물 제121호

8) 전주 풍남문 : 1768년 재건, 보물 제308호

9) 서울문묘 대성전(보물 제141호), 강릉향교 대성전(보물 제214호), 나주향교 대성전(보물 제394호), 영천향교 대성전(보물 제616호), 성주향교 대성전(보물 제1575호), 경주향교 대성전(보물 제1727호), 제주향교 대성전(보물 제1902호)

틀 구성이 썩 정교하게 보이지 않는 것으로 보아 건립 당시에 꾸며진 것인지 의문을 갖게 한다.

옥개부는 겹처마 맞배지붕으로 양측면에 풍판을 설치하였다.

단청은 현재 모로 단청이나 절제된 단순미를 추구한 향교건축의 규범으로 보아 원래는 지금보다 소박한 단청이었을 것으로 추정된다.

8. 지정가치 및 종합의견 :

장수향교 대성전은 1686년에 이건하고 1877년에 중수한 익공계 건물로 이건 당시 보다 늦은 시기의 것으로 보이는 익공춧가지의 초각수법과 화려한 천장 등 건축양식 전반이 현재 보물로 지정된 향교 대성전에 비추어 볼 때 뚜렷한 우위점을 찾을 수 없으므로 국보로 지정하기에는 미흡하다.

국가지정문화재 등의 지정조사보고서

조사일	2019. 7. 3.	대상문화재	장수 향교 대성전 (보물 제272호)	
조사자	성명	○○○	전공 분야	건축사
	소속		직위(직책)	
주요 지정 사항 검토	문화재 종류	국가지정문화재(국보)		
	문화재 명칭	장수향교 대성전		
	입지 현황 및 역사문화환경	세부내용 별첨 참조		
	연혁·유래 및 특징	세부내용 별첨 참조		
	지정 가치 및 근거기준	세부내용 별첨 참조		
	지정 대상 및 범위	<해당 문화재(문화재구역)> <보호물> <보호구역>		
보호 관리 사항 검토	문화재 보존 영향 행위기준 (안)			
	보존정비 및 활용 착안사항			
종합의견				

위와 같이 「문화재보호법 시행령」 제11조제3항 및 제13조제3항과 같은 법 시행규칙 제8조에 따라 국가지정문화재 등의 지정조사보고서를 제출합니다.

2020 년 1 월 일

제출자

(서명 또는 인)

문화재청장 귀하

1. 입지 현황 및 역사문화환경

전라북도 장수군 장수읍 향교길 31-41(장수리 254-1번지)에 자리한 장수향교는 조선 초인 1407년(태종 7년) 장수군 장수읍 선창리 당곡에 초창되었으나, 1685년(숙종 11년)~1686년(숙종 12년)에 걸쳐 현재의 위치로 옮겨 지은 것으로, 현재까지 330년 이상 제자리에서 원형을 유지하고 있는 귀중한 역사유산이다. 특히 이 때 창건 당시의 원형을 그대로 옮겨지었다고 하여, 조선 초 향교 건축의 원형을 잘 간직한 것으로 알려져 있다.

하지만 목조 건축의 특성상 원래의 모양과 재료를 어느 정도 유지하였는가는 원형을 유지하였다는 ‘이건’설에도 불구하고 세심한 관찰이 필요하다. 우리나라의 많은 향교와 달리 장수향교가 임진, 정유의 양 왜란 당시 피해를 입지 않은 것은 교복(校僕)이었던 정경손(鄭敬孫)의 활약이라고 전해지고 있다. 1597년 정유재란 시에 전라도에 진출한 왜군이 들이닥치자 다른 유림들은 모두 도망을 간 사리에 향교의 노비였던 종경손이 홀로 나서 적군 앞에서 왜군의 교내 진입을 막아섰다고 한다. 지금도 향교의 외삼문 앞에 이를 기리는 정충복비의 비각이 서있다.

뒷산인 관주산(官主山)의 이름에서 짐작할 수 있듯이 이 자리는 과거 관아가 자리하였던 곳으로, 현재도 주변에 장수군청과 장수 초등학교 등이 있는 읍내 시가지의 한쪽 가장자리에 자리한다. 이는 일반적으로 향교가 읍치에서 수 km 정도 떨어진 산기슭에 위치하는 것과 다르다.

거의 경사가 없는 평평한 터에 자리하였으며, 남북으로 길쭉한 대지를 크게 3개의 영역으로 나누어 안으로 진입할수록 보다 내밀한 공간을 만들고 있다. 제일 남쪽의 영역은 홍살문으로 구획되며 주차장으로 사용하는 너른 마당의 오른쪽으로 최근에 지은 유림회관과 관리사 등이 있다. 두 번째 영역은 외삼문인 부강문(扶綱門)과 그에 이어진 담장으로 둘러싸여 있다. 외삼문 바로 앞에 정충복비각(鄭忠僕碑閣)이 있고, 담장 안에는 명륜당이 먼저 자리하고 그 뒤로 좌우에 동서의 양재(敬誠齋, 進德齋)가 있고 좌측의 안쪽 깊숙한 곳에 사마재(司馬齋)가 있다. 마지막 영역은 다시 담장을 친 가운데 내삼문과 대성전이 있는 공간이다. 이외에 보일러실과 화장실, 물탱크와 펌프실 등이 경내의 앞뒤 구석에 자리한다. (그림 1. 참조)

향교의 일반적인 전학 후묘, 그리고 전라도 지역에서 많이 보이는 전당후재의 배치를 가지고 있다고 간단히 말할 수도 있지만, 다른 한편 평지에 자리한 향교의 경우 전주 향교나 나주향교, 경주 향교, 그리고 서울 성균관의 예에서 보듯 전묘후학의 배치를 갖는 경우도 많아 이채로운 경우라고 볼 수도 있다. 어쩌면 장수 향교가 자리하였던 당곡의 원형을 그대로 이어왔기 때문이라고 볼 수도 있고, 다른 한편으로는 17세기 후반이라고 하는 시기적 상황에 의한 결과일 수도 있다. 하지만 평지에 위치한 향교라 해

서 모두 전묘후학의 배치를 갖는 것은 아니고, 또 전학후묘의 경우가 워낙 사례가 드문 경우이기 때문에, 장수 향교의 배치 형식을 일반적이다 혹은 이례적이다 라고 어느 한쪽으로 단정하기는 어렵다.



그림 1. 장수 향교 배치 현황 (『국가지정문화재 신청자료, 장수향교 대성전』(2018, 장수군, 이하 ‘신청자료’)에서 전재)

2. 연혁

장수 향교는 전술한 대로, 1407년(태종 7년) 초창된 것을 1685년(숙종 11년)~1686년(숙종 12년)에 이 건한 것으로서, 그 내용은 ‘장수향교 이전사적비(1691년)’에 자세히 전한다. 초창된 선창리 당곡은 현재의 향교에서 북쪽으로 1~2km 정도 떨어진 관주산 너머의 지역으로 추정된다.

즉, 향교의 시설 설립은 1407년(태종7년)이고, 대성전을 비롯한 명륜당, 동서재의 완공은 1422년(세종 4년)의 일로 기록되어 있다. 이 건은 1681년(숙종 7년) 유림들의 발의로 계획이 마련되어, 1685년(숙종11년) 3월부터 1686년(숙종12년) 2월에 걸쳐 진행되었다.

많은 경우 임진 혹은 정유의 왜란시에 왜군의 성역 침범으로 더럽혀진 것을 회복하려는 의도에서 향교의 이건 혹은 재건이 이루어진 것에 반하여, 장수 향교의 경우 원래 향교가 자리한 곳에서 있었던 잦은 수해를 이건의 이유로 들고 있는 점이 이채롭다. 전라도에 왜군이 들이닥친 정유란 때는 교복의 활약으로 성역을 지킬 수 있었다고 전한다. 이 정충복을 기리는 ‘호성 충복 정경손 수명비(護聖忠僕鄭敬孫暨名碑)’는 1846년(현종 12년) 당시 현감 정주석(鄭胄錫)이 세운 것으로, 향교 앞에 있던 것을 1976년 현재와 같이 외삼문 앞으로 옮겨 세운 것이다. 그러므로 장수향교가 무사히 전란을 피할 수 있었다는 사실은 근래에 지어낸 말이 아니라 이미 전통 시기에도 그 사실을 널리 인식하고 과시하고 있었다는 사실을 확인할 수 있다.

이후, 1877년(고종 14년) 현감 홍우정(洪佑鼎)이 중수하였고, 1935년에도 보수의 기록이 있다.

한편, 아직 본격적인 문화유산에 대한 보존 사업이 시행되기 이전이었던 1957년 ‘장수향교 국보지정에 관한 건’ 첨부 도면상으로는, “대성전, 중문(내삼문 위치), 동협문, 사마재, 동재, 명륜당, 변소, 교복실, 신문(외삼문), 이건사적비, 정충복비” 등이 표시되어 있다. 이를 보아, 장수향교는 다른 많은 향교들이 근대화 과정에서 관청이나 교육기관 등으로 전용되었던 것과 달리, 일제 강점기에도 대성전 등 주요 건물이 그 자리를 지키고 있었음을 확인할 수 있다.

해방 이후의 주요한 보수 정비 이력은 다음과 같다.

- 1964년 외삼문(부강문) 건립
- 1969년 강당(明倫堂) 보수공사
- 1970년 문묘(大成殿) 보수공사, 부강문 중수
- 1971년 장수향교 중수 사적고비 건립
- 1973년 명륜당, 동재, 서재, 사마재, 양사재 보수
- 1976년 정화사업, 정경손 비각을 부강문 왼쪽으로 이전 단장함
- 1977년 대성전(大成殿) 보수공사
- 1980년 명륜당-대성전내삼문 진입로 박석도로 설치
- 1985년 대성전 기와변와공사 외 11개 사업(주변 정비)
- 1987년 홍살문 설치
- 1987년 안내관 보수
- 1990년 향교 관리사 개축
- 1992년 대성전 기와변와공사, 기단 바닥공사

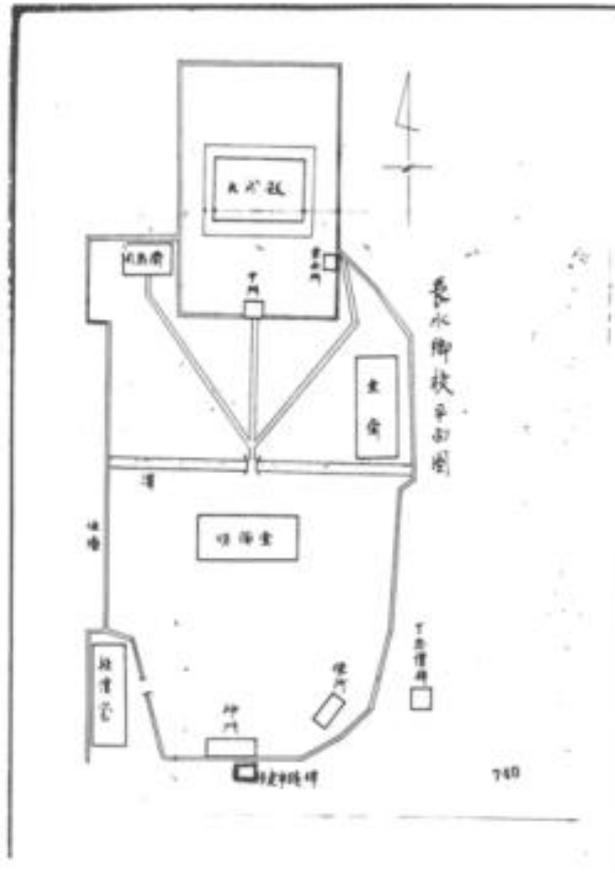


그림 2. 국가기록원 소장 '장수향교 국보지정에 관한 건' 첨부 도면 (4290년(서기 1957년) 2월 기안) ('국보신청자료(장수향교 대성전).pptx'에서 전제)

1997년 유림회관 신축, 외곽도로 정비 및 담장 설치
 2000년 사마재 복원 신축

이처럼 장수 향교의 경우, 임진·정유의 양 왜란과 1910년 국권 피탈과 그에 연이은 근대화 과정이라는 두 번의 궤멸 위기를 넘기고 연속성을 유지해온 점에서 특기할만하다. 하지만 목조건축의 특성상 위의 기록 외에도 크고 작은 보수 이력이 없을 수 없으며, 따라서 현재의 건축물이 창건 혹은 이진 당시의 것이라고 단정하기에는 어려움이 있다. 후술하겠지만, 목조건축의 편년에 주요한 근거가 되는 공포 양식상의 판단으로는 1420년 초창의 것은 물론, 1685년 이건의 것으로 보기에 곤란함이 있다. 다시 말해 전체적인 건축물의 규모와 공간 구성에 있어서, 그리고 무엇보다도 유림들이 중요시하는 승현의 공간적 분위기에서 원형을 유지하였을 것으로 추정할 수 있으나, 순수하게 건축적인 측면에서 본다면 이후 여러 차례 보수를 거치면서 부분적인 변화가 있었을

것으로 생각된다.

3. 건축적 특징

대성전은 정면 3칸, 측면 3칸의 단층 맞배집으로, 공포는 기둥 위에만 두었다. 기단은 화강석 장대석으로 돌렸으며, 전체적인 가구는 2고주 7량가의 짜임으로 하였는데, 전면의 퇴칸은 개방하여 외부로 열고 전면 고주면에 맞추어 문얼굴을 달아 내외부 공간을 구획하였다. 내부 공간에는 우물마루를 깔았다. 이처럼 개방된 전퇴 공간은 제관의 행례와 연관되어 있으며, 제사시설에서 흔하게 발견되는 형식이다.



그림 3. 장수향교 대성전 전경 (2019년 7월 3일 촬영)

내부 공간에는 따로 기둥을 두지 않고 통칸으로 푹 터진 공간을 만들었다. 대들보는 후면의 평주에서 전면 고주의 윗부분에 걸쳐 있고, 그 위로 중보는 전면 고주의 위와 후면 고주의 자리에 대공을 대들보 위에 두어서 받치고 있다. 중보의 가운데에 다시 대공을 한쌍 앞뒤로 두고 중보를 걸었는데, 이 중보 선에 맞추어 우물반자를 짜넣어서 연등천장으로 꾸민 다른 부분과 구분하였다.

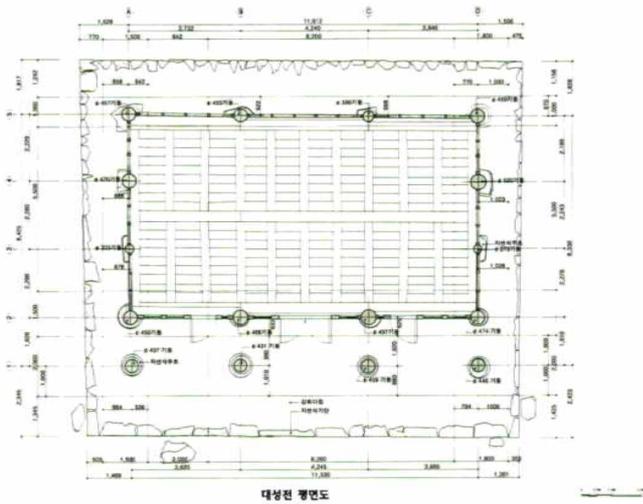


그림 4. 장수 향교 대성전 평면도 (‘신청자료’에서 전제)

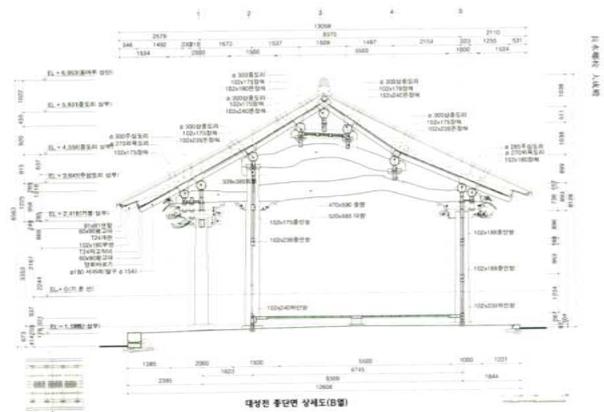


그림 5. 장수향교 대성전 종 단면도 (‘신청자료’에서 전제)

주칸은 정면 도리칸에서 어칸을 4,245mm, 향좌측 협칸은 3,620mm, 향우측 협칸은 3,665mm로 하여 어칸을 2척 정도 넓게 하였다. 후면에서는 이 수치가 각각 4,240mm, 3,732mm, 3,640mm로 조금 차이를 보인다. 변위가 심하여 영조척을 추정하기 어려우나 일반적인 조선시대의 영조척 기준으로 어칸을 12자, 좌우의 협칸을 12자 정도로 계획하였음을 알 수 있다.

보칸으로는 종도리선에 맞추어 중심에 주춧돌 위에 가는 원기둥을 양 측벽면에 두었으나, 기둥 머리가 고주선에 닿지 않아 온전한 기둥 칸수로 세지는 않는다. 전면 퇴칸과 어칸, 그리고 후면 퇴칸의 칸치수는 각각 1,610mm, 4,521mm, 2,198mm(우측벽면), 1,626mm, 4,570mm, 2,229mm(좌측벽면) 로서 전면퇴를 후면퇴보다 역시 2자 정도 작게 하였다. 좌우측의 전체 길이에서 95mm 정도의 작지 않은 차이가 난다.

전면을 제외한 삼면을 모두 널판벽으로 막았고, 전면에는 가운데 어칸에는 쌍여단이, 좌우의 현칸에는 외여단의 골판문을 달아 출입에 사용하였다. 문짝에는 중간 앵루 높이가 지 띠살로 문살을 짜넣고, 좌우의 협칸의 외쪽문 바깥으로도 녀살의 살창을 두어 채광에 대비하였다. 예서는 채광을 위한 녀살창을 문문얼굴의 좌우와 인방 위로는 나머지 벽면과 같이 널판벽으로 메꾸었다.

공포는 전후면의 기둥 위에만 놓여서 모두 8구가 있다. 기둥 머리에서 창방과 함께 초익공이 짜이고, 기둥머리에 주두를 놓고 그 위로 이익공, 삼익공이 보방향으로 놓이고, 도리 방향으로는 외부로는 2출목으로 튀어나가면서 소침차와 대침차를 아래위로 겹쳐

쌓았다. 주심부에서는 대침차보다도 더 큰 주심대침차를 주두 위에서 이익공과 직교로 짠 위에 장여를 3단 겹쳐 쌓아 주심도리를 받쳤고, 1출목에서는 소침차와 대침차를 순서 대로 쌓은 다음 장여를 걸고, 2출목에서는 소침차 위에 장여를 두고 출목도리를 받쳤다. 출목도리 장여 하단에 맞추어 순각판을 달아 서까래를 가렸다. 내부로는 익공의 내단을 모두 한 몸으로 엮어 초각으로 장식하였다.

이와 같은 2출목 3익공의 공포 형식은 조선 후기의 건축에서 발견되는 특징이다. 특히 초익공과 이익공의 외단에는 양서형의 쇠서를 초각하고 그 위에 연꽃을 초각하였으며, 그 위에 놓이는 삼익공의 외단은 방향을 바꾸어 아래로 만곡한 초가지를 만들고, 그 위의 보머리엔 봉두형의 초각을 새겨 장식하였는데, 이러한 공포 외부의 꾸밈은 조선 후기 다포식 공포의 살미 외단에서 보는 것과 같다. 다시 말해 장수 향교의 공포 형식은 다포식 공포의 영향을 받아 장식화되어 가면서 출목수가 늘어난 조선후기 익공식 공포의 특징을 고루 갖추고 있다고 할 수 있다.

기둥 사이에는 각 주간에 창방 위에 두 구의 화반을 주심대침차와 같은 높이로 두고, 그 위에 장여를 겹쳐 쌓아서 주심도리를 받치고 있다. 지붕 처마는 겹처마로 하였고, 양 박공벽에는 방풍판을 달았다.

4. 종합 검토의견

현재 보물로 지정된 향교 건축물은, 강릉향교 대성전, 나주향교 대성전, 영천향교 대성전, 성주향교 대성전, 경주향교 대성전, 제주향교 대성전, 그리고 장수 향교 대성전 등이다. 장수향교 대성전은 조선 중기의 왜란과 20세기초의 국권피탈과 근대화의 과정이라는 두 번의 큰 위기를 넘겨 원래 공간이 가지고 있던 상징적 의미와 분위기를 잘 유지하였다는 점에서 높이 평가할만하다. 이러한 점이 장수 향교 대성전을 보물로 지정하여 관리하게 하는 이유가 되었을 것이다. 이 점은 충분히 동감을 하지만, 국보로 지정되기 위해선 보다 엄밀한 가치 기준이 필요하다. 가령 국보로 지정되기 위해서는 유사한 것들 가운데 독보적인 가치를 갖거나 아니면 다른 유례를 찾아보기 힘든 유일한 것이어야 할 것이다. 장수 향교 대성전의 경우를 놓고 생각하면, 현재의 건물은 그 건축의 양식상 소작의 시기를 18세기 후반 이전으로 올려보는 것이 어렵다고 생각되고, 그 자체가 갖는 예술적인 가치 역시 비슷한 수준의 건축문화재가 많이 있다고 볼 수 있다.

결론적으로 장수 향교 대성전은 국보 승격지정에 적당한 자격을 갖추었다고 보기 어렵다고 판단된다.



그림 6. 장수향교 대성전의 전면 공포 상세 사진 (2019년 7월 3일 촬영)



그림 7. 1767년 화재 이후 재건된 전주 풍남문 공포
(장수향교 대성전과 비슷한 2출목3익공식의 공포를
가지고 있다.)

국가지정문화재 등의 지정조사보고서

조사일	2019. 7. 3.	대상문화재	장수향교 대성전 (보물 제272호)	
조사자	성 명	○ ○ ○	전공 분야	한국건축사
	소 속		직위(직책)	
주요 지정 사항 검토	문화재 종류	국가지정문화재(국보)		
	문화재 명칭	장수향교 대성전		
	입지 현황 및 역사문화환경	세부내용 별첨 참조		
	연혁·유래 및 특징	세부내용 별첨 참조		
	지정 가치 및 근거기준	세부내용 별첨 참조		
	지정 대상 및 범위	<해당 문화재(문화재구역)> <보호물> <보호구역>		
보호 관리 사항 검토	문화재 보존 영향 행위기준 (안)			
	보존정비 및 활용 착안사항			
종합의견				

위와 같이 「문화재보호법 시행령」 제11조제3항 및 제13조제3항과 같은 법 시행규칙 제8조에 따라 국가지정문화재 등의 지정조사보고서를 제출합니다.

2020 년 1 월 일

제출자

(서명 또는 인)

문화재청장 귀하

1. 입지현황 및 역사문화환경

입지현황

장수향교는 전라북도 장수군 장수읍 장수리 254-1번지 관주산 아래에 위치해 있다. 서쪽으로는 금강을 낀 평탄지에 장수군청이 있고, 군청 뒤편으로 장수초등학교가 자리 잡고 있으며, 장수초등학교와 담장을 면해서 장수향교가 있다. 조선시대 여러 읍지에 묘사된 장수군의 모습은 관주산 아래 남쪽으로 관아가 중앙에 위치하고 그 뒤편으로 객사가 자리를 잡고 객사 측면 후방에 향교가 묘사되어 있다. 향교가 입지한 터는 해발 420m 부근으로 고저차가 거의 없는 평탄지이지만 장수읍에서는 가장 높은 지대에 속한다. 보물 제272호로 지정된 장수향교 대성전은 장수향교 안에서 가장 안쪽에 자리를 잡고 있다.

역사문화환경

장수향교가 소재한 장수읍 주변은 전체적으로 저층 건물로 이루어져 있다. 현재 군청 위치는 조선시대 관아 자리이며, 장수초등학교는 조선시대 객사 자리에 해당된다. 그 동편에 담장을 면해서 향교가 자리하고 있는 점은 문헌기록과 일치한다. 이로 보아 현재 향교는 조선후기 읍치의 배치 상황을 지금까지 유지하고 있다는 점을 알 수 있으며, 장수향교가 유서 깊은 역사문화환경을 간직하고 있음을 확인할 수 있다. 향교 전면에 중수한 이력을 적은 사적비를 비롯하여, 진입부에 1846년에 세운 정축복비(전라북도 문화재자료 제38호)가 비각 안에 있다.

2. 연혁·유래 및 특징

연혁·유래

「장수향교이건사적비」(1691년) 등 장수향교와 관련한 기록에 의하면, 장수향교가 처음 지어진 시기는 1407년(태종 7)이며 처음 위치는 장수군 선창리 당곡이었다고 한다. 이 건 사유를 보면, 건물 터가 낮고 비가 새서 1681년(숙종 7) 현재의 위치로 이 건하기를 조정에 청하여 허락을 얻었으며 새 터전에서 건물이 완성된 시기는 1686년(숙종 12)이다.

이 건한 뒤의 모습을 두고 「장수향교이건사적비」에는 대성전, 명륜당, 동서재, 문간 등이 마련되었다고 기록하고, “예법에 맞다”라고 평가하고 있어 당시 향교

의 전형으로 이해하고 있음을 볼 수 있다. 여기서 이견한 사유 가운데 주목하지 않았던 『학교등록』에 적힌 내용은 눈여겨 볼 필요가 있다. 이 기록에 따르면 “지세가 좁아서 명륜당을 창건할 곳이 없기 때문”이란 연유가 전해지기 때문이다(조상순, 「조선 중기 이전 향교건축의 형성과 전개, 성균관대학교 박논, 2012). 이 점에 대해서는 향후 논의가 필요하다.

장수향교는 1597년 정유재란 당시 왜군의 침입을 당하였지만, 정경순이란 인물이 힘써 건물을 지켜 건물 소실을 면했다고 한다. 현재도 그 행적을 적은 비문이 향교 정문 옆에 있다. 1877년(고종 14)에는 현감 홍우정이 주도하여 중수한 뒤 현재에 이르고 있다.

건물배치

향교의 건물 배치는 약간 비튼 상태지만 밖에서부터 외삼문, 명륜당, 내삼문, 대성전이 놓여 있다. 명륜당 뒤로 동재와 서재가 마주보고 있다. 대성전은 담장 안에 별도 영역을 이루고 있으며, 동무와 서무는 없다.

대성전을 진입부 전면에 두고 명륜당을 뒤에 배치하는 향교 배치사례는 조선 초기에 건립된 향교(나주향교, 경주향교 등)에서 나타나며, 조선후기에 건립된 향교 대부분은 명륜당을 전면에, 대성전을 뒤에 두는 배치를 고려하면 장수향교는 전형적인 조선후기 배치 방식을 따르고 있다고 할 수 있다. 또한 장수향교에 중국과 조선의 선현 위패를 봉안하는 동무와 서무를 건립하지 않은 점은 향교의 일반 격식에서 다소 벗어나는 점이다.

대성전의 건축특성

대성전은 정면 3칸, 측면 3칸, 맞배지붕 건물이며 공포는 출목 익공으로 짚다. 건물은 전체적으로 분명한 특이점은 보이지 않고 조선후기에 건립된 일반적인 향교 대성전의 건축형태를 따르고 있다. 익공의 짜임새나 쇠서의 봉황 장식은 전형적인 조선후기의 시대 특징을 반영하고 있고, 기둥 사이마다 두 개씩 배치한 화반 역시 두 단의 꽃잎이 좌우로 벌어진 모습을 형상화한 형태로 익공과 같은 시기의 장식적 특색을 갖추고 있다. 네 모서리 기둥 중간 지점에서 휘어진 부재를 끼워 상부에서 주심도리를 지지한 점은 조선시대 다른 목조건물에서 흔히 보는 기법은 아니다. 이런 곡선부재를 써서 지붕 양끝이 처짐을 방지하는 효과를 노린 점은 특이하다.

3. 지정가치 및 근거기준

장수향교 대성전의 보물 지정경위

장수향교 대성전은 현재 보물 제272호로 지정되어 있으며 지정 일시는 1963년 1월 21일이다. 우리나라 문화재 지정은 1933년 조선총독부가 제정한 조선보물고적명승천연기념물보존령에 따라 시작되었으며 1934년부터 1943년까지 보물 419점, 고적 145점, 천연기념물 133점, 고적 및 명승 3점이 지정되었다. 이 가운데 향교로는 서울문묘(보물 236호), 안동문묘(보물 302호), 해주향교 대성전(보물 381호), 강릉향교 대성전(보물 425호)이 포함되었다.

광복 후 1948년에 보물 명칭을 국보로 변경하였으며, 1956년에 문교부는 국보고적명승천연기념물보존회를 운영하여 각 지방의 요청에 따라 중앙고적위원회의 현지조사 및 건의를 통해 국보지정을 추진하였다. 장수향교 대성전은 이 과정에서 1957년 국보 420호로 지정되었다. 이 기간에 국보로 지정된 건물은 1957년까지 국보367점, 고적 105점, 고적명승 3점, 명승천연기념물 1점 천연기념물 111점 등 모두 587점을 지정되었다(『경향신문』, 1957년 11월 22일자 기사). 정부는 1962년 1월 10일 문화재보호법을 제정하여 종전의 국보를 국보와 보물로 구분하여 문화재의 재지정을 시행하였다. 이듬해 시행된 지정에서는 목조건물 11점이 국보로 지정되고, 장수향교는 보물 272호로 지정되었다.

4. 종합의견

장수향교 대성전 건물은 역사적인 유래로 보면 임진왜란의 병화를 입지 않은 건물로 알려져 있지만, 현재의 건물에서 16세기 이전의 시대 특징을 반영하는 부분은 뚜렷하게 확인하기 어렵다. 향교 전체의 배치 방식은 1681년 현 위치로 이전한 이후의 양상을 보여주고 있다. 대성전은 정면 3칸, 측면 3칸의 맞배지붕 익공식 건물로, 건물의 짜임에서 특별한 가치를 찾아보기 어려우며 17세기 이후에 건립되는 향교 대성전의 일반적인 모습을 보여주고 있다. 공포의 세부 형상은 장식이 크게 가미된 출목 익공과 화반을 갖추어 마지막 큰 수리가 있었던 1877년의 시대 특징도 반영되어 있는 것으로 판단된다. 모서리 기둥 네 곳에 주심도리를 지지하는 곡선 부재를 가미한 점이 눈길을 끌지만 이 부분이 건물의 가치를 높이는데 크게 기여하는 요소로 판단하기 어렵다. 따라서, 본 건물은 국보로 지정할 만한 돋보이는 가치를 보유하고 있다고 평가되지 않는다.

16. 완주 안심사 요사채(공양간) 개축공사 설계 검토(2차)

가. 제안사항

‘19년 문화재보수정비 국고보조사업으로 「완주 안심사 금강계단」 주변 요사채(공양간) 개축공사 계획을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- ‘19년 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진 중인 「완주 안심사 금강계단」 주변 요사채(공양간) 개축에 대하여 검토 받고자 하는 사항임.
- ※ ‘19년 문화재위원회 제12차 건축문화재분과 심의결과(2019.11.21) : 부결
- 역사문화 환경 훼손 우려(규모 축소 필요)

다. 주요내용

- (1) 대상문화재 : 완주 안심사 금강계단
 - 소재지 : 전북 완주군 운주면 완창리 26번지 외 1필지
 - 지정일 : 2005. 06. 15.
- (2) 사업내용
 - 사업위치 : 전북 완주군 운주면 완창리 산 31-1번지
 - 사업예산 : 2019년 설계 190백만원(국비 133백만원, 지방비 57백만원)
 - 사업지침 : 관계전문가의 자문을 받아 노후된 요사채(공양간)를 개축하기 위한 설계도서를 작성한다. 주변과 조화되는 적정규모로 설계한다.

○ 주요내용

구분	1차 (‘19.11.21. / 부결)	금차	
	요사채(공양간) 1동	요사채(1동)	공양간(1동)
대지면적	202,964m ²	좌동	
건축 연면적	532.24m ² (지하1층 147.6m ² , 지상1층 384.64m ²)	95.04m ² (지하1층 없음, 지상1층 95.04m ²)	239.5m ² (지하1층 84.06m ² , 지상1층 155.52m ²)
구조	지하1층 (철근콘크리트 라멘조) 지상1층 (한식목구조 7,5량가, 초익공양식)	지하1층 (없음) 지상1층 (한식목구조 5량가, 초익공양식)	지하1층 (철근콘크리트 라멘조) 지상1층 (한식목구조 5량가, 초익공양식)
최고높이	10.72m	7.33m	10.72m
지붕	팔작지붕	팔작지붕	팔작지붕
실구성	· 지하1층 : 화장실, 샤워탈의실, 창고, 보일러실, 발표실 · 지상1층 : 주지실, 응접실, 방(1~4), 공양실, 주방 공양주방, 냉동고, 창고(1~3), 작업실	· 지하1층 : - · 지상1층 : 주지실, 응접실, 방(1~2)	· 지하1층 : 화장실, 샤워실, 보일러실, 발표실 · 지상1층 : 공양실, 주방, 공양주방, 창고

라. 의결사항

○ 조건부가결

- 건물 주변 지형·축대·마당은 재조정 필요
- 건축 양식 조정 필요(팔작지붕 등)

○ 의결정족사항

- 출석 9명 / 조건부가결 8명, 제척 1명

17. 장성 백양사 소요대사탑 이전 보호시설 개보수 검토

가. 제안사항

‘19년 문화재보수정비 국고보조사업으로 「장성 백양사 소요대사탑」 주변 보호시설 개보수 계획을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- ‘19년 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진 중인 「장성 백양사 소요대사탑」 이전 보호시설 개보수에 대하여 검토 받고자 하는 사항임.

다. 주요내용

(1) 대상문화재 : 장성 백양사 소요대사탑

- 소재지 : 전남 장성군 북하면 약수리 20번지
- 지정일 : 2002. 09. 25.

(2) 사업내용

- 사업위치 : 전남 장성군 북하면 약수리 20번지
- 사업예산 : 2019년 설계 150백만원(국비 105백만원, 지방비 45백만원)
- 사업지침 : 소요대사탑을 보호시설 내로 옮기기 위해 관계전문가 자문을 받아 시설 개보수를 위한 설계도서를 작성한다.

○ 주요내용

- 수장고 영역

- 기존 화장실 및 준비실을 수장고로 포함(기존 99㎡ ⇒ 신설 117.0㎡)

- 전시실 영역 :

- 제1전시실(198.72㎡) : 기존 복층구조에서 단층구조로 변경
- 제2전시실(80.33㎡) : 기존 사무실 공간을 전시공간으로 활용
- 기획전시실(84.59㎡) : 기존 전시 준비실 활용(소요대사탑 이전 전시)

- 기타 영역
 - 하역장 및 공조실 신설
 - 진입 방풍실 신설
 - 관리실(14.59m²) 신설
 - 기존 인입홀 철거
- 주변정비
 - 기존 담장 철거 : L=133.7m
 - 주변 배수로 정비 : L=92m

- ※ 소요대사탑 이건을 위한 보양 (경주 불국사 삼층석탑 수리보고서 참고)
- 이건을 위한 해체시 열화에 따라 발생한 박리, 균열 부위 등에 인양 하중이 가해지지 않도록 조치를 취해야 함
 - 또한, 필요시 한지, 스폰지, 광목, 테이핑 등으로 부재를 보양해야 함
 - 표면 박리 및 지의류 탈락 등을 방지하기 위해 1차 한지, 2차 표면 보호용 비닐, 3차 충격 흡수를 위한 압박붕대 또는 스펀지 등을 이용하여 보양
 - 충분한 보양 후 육송 등의 버팀대를 균일하게 배치하고 체결식 슬링 벨트 사용으로 고정
 - 석조문화재의 특성상 정확한 무게를 측정하기 어려운 상황
 - 소요대사탑의 체적상 무게를 약 5ton으로 가정
 - 소요대사탑이 모셔져 있는 정보박물관의 경우 고정형 호이스트 사용이 어려운 상황
 - 이에 적재능력 5ton 이상의 지게차를 이용하는 방안 고려

라. 의결사항

- 조건부가결
 - 관계전문가 자문을 받아 진입부 공간계획 등을 수정토록 함.
- 의결정족사항
 - 출석 9명 / 조건부가결 9명

【보고사항】

안건번호 건축 2020-02-018

18. 종묘 정전 보수정비 보고

가. 보고사항

서울 종로구 소재 사적 「종묘」 내 국보 「종묘 정전」의 보수공사 추진계획을 보고합니다.

나. 보고사유

- 사적 「종묘」 내에 위치한 국보 「종묘 정전」의 노후화 등으로 주요 구조부재, 배면기와 및 월대 등의 파손 및 이격이 발생하여 보수하고자 함.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 문화재청장(궁능유적본부장)
- (2) 대상문화재 : 종묘 정전
 - 소재지 : 서울 종로구 훈정동 1-2
 - 지정일 : 1985. 01. 08.
- (3) 신청내용
 - 위치 : 종묘 정전
 - 사업기간 : 2020년 5월 ~ 완료 시까지
 - 사업내용 : 종묘 정전 기와공사, 목공사, 석공사 및 주변정비 등

라. 참고사항

- 관계전문가 자문('19.02.14. / ○○○·○○○·○○○·○○○)
 - 정밀실측은 지침에 따라 수행하며 3D스캔, 광파기 등의 장비를 사용하여 정밀성을 높여 결과를 보수설계에 반영하도록 함.
 - 증축에 대한 사료를 충분히 조사하여 증축부위를 면밀하게 조사하여 증축 과정에서의 차이가 있는 부분에 대한 조사가 이루어져야 함.

- 지붕의 하중을 균일하게 유지하도록 지붕무게 배치를 고려하여 무게 저감을 위해 지붕전체를 수제기와로 교체하도록 하며, 월대 및 동북측 기단은 현황을 유지하되 밀림이 심하게 일어난 서북측 월대는 드잡이 보수가 필요함.
- 종묘제례행사 등을 고려하여 국가적인 행사와 관람객의 편의에 문제가 없도록 설계에 적절히 제반사항을 반영하도록 함.

○ 관계전문가 자문('19.07.24. / ○○○·○○○·○○○)

- 배부름이 심한 서측월대는 해체 후 재설치하되, 일부 구간은 트렌치 발굴 조사를 통해 월대 하부 지정을 확인하고 면밀히 시공하도록 함.
- 종묘 정전 수제기와 제작 설치는 막대한 물량이 소요됨을 감안하여 제작 현황 및 수량 등을 종합적으로 검토하여 기와 교체 계획을 수립하도록 하며, 현재 남아 있는 기와 중에 구기와의 규격을 확인하여 수제기와제작에 참고하도록 함.
- 종묘 정전의 상징성을 고려하여 균열, 이완 및 파손된 각 목부재별 교체, 보강 후 재사용, 해체 방법 등을 다양하게 검토하여 설계에 반영할 수 있도록 하며,
- 정전 정면 퇴칸 바닥 시멘트 몰탈은 영건의케 등 고증자료 및 조선 후기 부터 일제강점기 수리기록 등을 면밀히 조사한 후 관계전문가 고증 등을 거쳐 전통방전으로 교체하도록 함.
- 종묘 정전 보수공사 기간 및 공사 효율성을 감안하여 가설 덧집은 수제기와 제작기간 등을 검토 후 현장여건에 맞는 방식과 일정계획을 수립하고, 정전 내부 신주 등의 이전 및 보존방안 등에 대하여 대동이씨종약원 등과 협의 하여 진행하도록 함.

마. 의결사항

- 원안접수
- 의결정족사항
 - 출석 9명 / 원안접수 9명

19. 2020년도 문화재 재난안전 관리 사업 추진계획 보고

가. 보고사항

'20년 문화재 재난안전 관리 국고보조사업으로 추진 중인 강원도 평창군 소재 보물 「평창 오대산 적멸보궁」 등 71건 재난방지시설 구축(소방, 방범, 전기, ICT), 문화재 방재IoT시스템(침입방지) 구축사업에 대한 사항을 보고 드립니다.

나. 보고사유

- '20년 문화재 재난안전 관리 국고보조사업으로 추진 중인 강원도 평창군 소재 보물 「평창 오대산 적멸보궁」 등 71건 재난방지시설 구축(소방, 방범, 전기, ICT), 문화재 방재IoT시스템(침입방지) 구축사업 추진계획에 대한 적정성을 보고하고자 함.

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 문화재청장(안전기준과장)
- (2) 사업내용
 - 사업기간 : '20년 1월 ~ 사업종료 시 까지
 - 사업대상 : 「평창 오대산 적멸보궁」 등 71건
 - 8,865,534천원(국비 : 5,847,884천원, 지방비 : 3,017,650천원)
 - 사업추진방법
 - 문화재청 : 국고보조금 교부, 사업지침 시달, 설계검토·승인 등
 - 지방자치단체 : 설계도서작성, 사업시행, 사업감독 등

라. 검토의견

- 화재에 취약한 국보·보물 목조문화재 등에 문화재 재난방지시설 구축(소방, 방범, 전기, ICT), 문화재 방재IoT시스템(침입방지) 구축을 하는 사업이므로 사업내용이 적당하다고 판단됨.

마. 의결사항

○ 원안접수

○ 의결정족사항

- 출석 9명 / 원안접수 9명

[붙임]

2020년 문화재 재난안전 국고보조사업(국보·보물 분야) 세부현황

시도	시군구	지정별		문화재명	분야	예산액(천원)		
		종목	지정번호			국비	지방비	합계
서울	노원구	보물	1524	서울 이유타 한글영비	방법	35,000	15,000	50,000
대구	달성군	보물	1814	대구 운흥사 목조아미타여래삼존좌상	소방	210,000	90,000	300,000
광주	동구	보물	1507	광주 자운사 목조아미타 여래좌상 및 복장유물	방법	4,900	2,100	7,000
경기	가평군	보물	1793	가평 현등사 동종	전기	75,000	75,000	150,000
경기	남양주시	보물	1792	남양주 봉선사 비로자나삼신괘불도(사전설계)	전기	10,000	10,000	20,000
경기	안성시	국보	296	철장사오불회괘불탱	전기	50,000	50,000	100,000
경기	여주시	보물	180	여주 신륵사 조사당	전기	50,000	50,000	100,000
경기	이천시	보물	822	이천 영월암 마애여래입상	소방 방법	210,000	90,000	300,000
경기	화성시	보물	1942	화성 용주사 대웅보전	소방	210,000	90,000	300,000
경기	화성시	보물	1942	화성 용주사 대웅보전	전기	75,000	75,000	150,000
강원	철원군	보물	223	철원 도피안사 삼층석탑	전기	25,000	25,000	50,000
강원	철원군	국보	63	철원 도피안사 철조비로자나불좌상	소방	210,000	90,000	300,000
강원	평창군	보물	1995	평창 오대산 적멸보궁	소방	176,400	75,600	252,000
충북	진천군	보물	404	진천 연곡리 석비	방법	10,500	4,500	15,000
충북	청주시	보물	1258	청주 보살사 영상회괘불탱	소방	105,000	45,000	150,000
충남	논산시	보물	408	논산 쌍계사 대웅전	소방	168,000	72,000	240,000
충남	논산시	보물	408	논산 쌍계사 대웅전(사전설계)	소방 방법 전기	14,000	6,000	20,000
충남	예산군	국보	49	예산 수덕사 대웅전(사전설계)	소방	21,000	9,000	30,000
충남	예산군	국보	49	예산 수덕사 대웅전	소방	56,000	24,000	80,000
충남	천안시	보물	1261	천안 광덕사 노사나불괘불탱	소방	210,000	90,000	300,000
충남	천안시	보물	1246	천안 광덕사 감역교지	전기	10,000	10,000	20,000
전북	남원시	국보	10	남원 실상사 백장암 삼층석탑	방법	58,100	24,900	83,000

시도	시군구	지정별		문화재명	분야	예산액(천원)		
		종목	지정번호			국비	지방비	합계
전북	완주군	보물	1243	완주 송광사 대웅전	전기	100,000	100,000	200,000
전북	완주군	보물	1244	완주 송광사 종루	방법	18,900	8,100	27,000
전북	완주군	보물	1853	완주 정수사 목조아미타여래삼존좌상	소방	136,500	58,500	195,000
전북	장수군	보물	272	장수향교 대성전	소방	37,184	15,936	53,120
전남	강진군	보물	1315	강진 무위사극락전내벽사면벽화	방법	35,000	15,000	50,000
전남	구례군	보물	2024	구례 천은사 극락보전	전기	125,000	125,000	250,000
전남	구례군	보물	2024	구례 천은사 극락보전	방법	245,000	105,000	350,000
전남	구례군	보물	924	구례 천은사 극락전아미타후불탱화	소방	210,000	90,000	300,000
전남	구례군	국보	53	구례 연곡사 동승탑	소방	210,000	90,000	300,000
전남	나주시	보물	1310	나주 불회사 대웅전	소방	140,000	60,000	200,000
전남	순천시	보물	804	순천 정혜사 대웅전(사전설계)	전기	10,000	10,000	20,000
전남	순천시	보물	831	순천 동화사 삼층석탑	전기	40,000	40,000	80,000
전남	영암군	국보	50	영암 도갑사 해탈문(사전설계)	소방	14,000	6,000	20,000
전남	장흥군	보물	795	장흥 천관사 삼층석탑	전기	25,000	25,000	50,000
경북	경산시	보물	429	경산 불굴사 삼층석탑	소방	224,000	96,000	320,000
경북	경주시	보물	413	경주 독락당	전기	30,000	30,000	60,000
경북	군위군	보물	2005	군위 범주사 괘불도	소방	196,000	84,000	280,000
경북	구미시	보물	1945	구미 대둔사 대웅전	소방	105,000	45,000	150,000
경북	문경시	보물	1640	문경 김룡사 영산회괘불도	소방	88,900	38,100	127,000
경북	문경시	보물	1574	문경 봉암사 극락전	전기	165,000	165,000	330,000
경북	문경시	국보	321	문경 대승사 목각아미타여래설법상	소방	228,000	97,700	325,700
경북	영주시	국보	18	영주 부석사 무량수전	방법	70,000	30,000	100,000
경북	영천시	보물	513	영천 선원동 철조여래좌상	방법	28,000	12,000	40,000
경북	영천시	보물	514	영천 은혜사 운부암 금동보살좌상	방법	28,000	12,000	40,000
경북	영천시	보물	652	영천 이형상 수고본	방법	28,000	12,000	40,000
경북	영천시	보물	1271	영천 수도사 노사나불괘불탱	소방	140,000	60,000	200,000
경북	청송군	보물	1570	청송 대전사 보광전	전기	30,000	30,000	60,000

시도	시군구	지정별		문화재명	분야	예산액(천원)		
		종목	지정번호			국비	지방비	합계
경북	청송군	보물	1570	청송 대전사 보광전	소방	24,500	10,500	35,000
경남	밀양시	보물	147	밀양 영남루	방법	7,000	3,000	10,000
경남	창녕군	보물	212	창녕 관룡사 대웅전	전기	75,000	75,000	150,000
경남	양산시	국보	290	양산 통도사 대웅전 및 금강계단	소방	154,000	66,000	220,000
충북	제천시	보물	94	제천 사자빈신사지 사사자 구층석탑	IoT	35,000	15,000	50,000
충남	공주시	보물	150	공주 반죽동 당간지주	IoT	38,500	16,500	55,000
전남	장흥군	보물	1664	장흥 풍아익	IoT	21,119	9,051	30,170
경북	의성군	보물	188	의성 관덕리 삼층석탑	IoT	77,000	33,000	110,000
경북	구미시	보물	469	구미 낙산리 삼층석탑	IoT	94,500	40,500	135,000
경북	경주시	국보	112	경주 감은사지 동·서 삼층석탑	IoT	53,900	23,100	7,000
경북	경주시	국보	31	경주 첨성대	IoT	42,000	18,000	60,000
경북	경주시	국보	39	경주 나원리 오층석탑	IoT	52,500	22,500	75,000
경북	경주시	보물	68	경주 황남동 효자 손시양 정려비	IoT	29,400	12,600	42,000
경북	경주시	보물	168	경주 천군동 동·서 삼층석탑	IoT	41,797	17,913	59,710
경북	경주시	국보	40	경주 정혜사지 십삼층석탑	IoT	49,000	21,000	70,000
경북	경주시	보물	124	경주 남산동 동·서 삼층석탑	IoT	28,000	12,000	40,000
경북	경주시	보물	121	경주 굴불사지 석조사면불상	IoT	52,500	22,500	75,000
경북	경주시	보물	65	경주 서악동 삼층석탑	IoT	77,000	33,000	110,000
경북	구미시	보물	1122	구미 황상동 마애여래입상	IoT	29,820	12,780	42,600
경북	구미시	보물	490	구미 금오산 마애여래입상	IoT	63,000	27,000	90,000
경북	구미시	보물	469	구미 낙산리 삼층석탑	IoT	44,660	19,140	63,800
경남	사천시	보물	614	사천 홍사리 매향비	IoT	56,304	24,130	80,434

20. 2020년도 문화재보수정비 국고보조사업 추진계획 보고

가. 보고사항

2020년도 국보·보물 대상 문화재보수정비 국고보조사업 추진계획을 보고드립니다.

나. 보고사유

- 2020년도 국보·보물 대상으로 추진 예정인 문화재보수정비 국고보조사업에 대하여 보고하는 사항임.

다. 주요내용

(1) 사업내용

- 문화재보수정비(국보·보물) 국고보조사업(건조물문화재 지정·보호구역 및 역사문화환경보존지역 내 사업, 동산문화재 주변정비 사업 포함)
 - (총액사업) 보물 제1524호 서울 이유탕 한글영비 등 355건
106,319백만원(국비 74,127백만원)
 - (세계유산) 보물 제1413호 보은 법주사 철술 등 21건
5,890백만원(국비 4,123백만원)

- 사업기간 : 2020. 2월 ~ 12월

(2) 사업추진방법

- 문화재청 : 지방자치단체(각 시·도)에 국고보조금 교부
- 지방자치단체 : 사업집행

(3) 행정사항

- 2020년도 문화재보수정비(국보·보물) 국고보조사업은 문화재보호법 제35조에 따른 현상변경허가를 받은 것으로 같음하고자 함.

- 당해문화재 수리 및 주변정비 사업 중 중요사항은 별도로 문화재위원회의 검토를 거쳐 추진(붙임 현황에 별도 표기)
 - 당해문화재 해체수리·이전·복원 시 범위와 방향에 대한 검토가 필요한 사업
 - 주변정비 사업 중 규모·위치·양식·재료·경관에 대한 검토가 필요한 사업을 수리기술과 협의를 거쳐 대상 선정
- ※ ‘20년 총액사업 355건 중 20건 검토 / 세계유산 21건 중 2건 검토
- ‘19년 총액사업 338건 중 25건 검토 / 세계유산 17건 중 2건 검토

라. 의결사항

- 원안접수
- 의결정족사항
 - 출석 9명 / 원안접수 9명

[붙임1]

2020년도 문화재 보수정비(국보·보물) 국고보조사업 현황

시 도	소재지	지정별	문화재명	사업내용	예산액(천원)			비고 (별도 검토)
					국비	지방비	계	
서울	노원구	보물 제1524호	서울 이윽탁 한글영비	정밀실측	28,000	12,000	40,000	
서울	노원구	보물 제1524호	서울 이윽탁 한글영비	영비세척및진입로정비	70,000	30,000	100,000	
서울	동대문 구	보물 제763호	대불정여래밀인수증요 의제보살만행수능엄경(언해) 권78, 910	수장고 보수정비 공사	34,346	80,142	114,488	
서울	성북구	보물 제748호	서울 경국사 목각아미타여래설법상	극락보전 주변 석축 및 배수로 공사	371,000	159,000	530,000	
서울	성북구	보물 제1891호	서울 흥천사 금동천수관음보살좌상	사찰입구 주변 석축 정비 설계	42,000	18,000	60,000	
서울	성북구	국보 제70호	훈민정음	간송유물수장고건립	3,123,400	1,338,600	4,462,000	
서울	성북구	보물 제579호	괴산 외사리 승탑	하대석 결손부 복원	3,892	1,668	5,560	
서울	성북구	보물 제580호	문경 오층석탑	지대석 결손부 복원	4,137	1,773	5,910	
서울	은평구	보물 제1580호	서울 수국사 목조아미타여래좌상 및 복장유물	수국사 수장고 건립 설계	56,000	24,000	80,000	
서울	은평구	보물 제1580호	서울 수국사 목조아미타여래좌상 및 복장유물	사찰 경내 계단 및 진입로 정비, 대웅전 앞 석축 정비	196,000	84,000	280,000	
서울	은평구	보물 제657호	서울 삼천사지 마애여래입상	종합정비계획 수립	70,000	30,000	100,000	
서울	종로구	보물 제141호	서울 문묘 및 성균관<대성전·동무 ·서무·삼문·명륜당 >	신삼문 보수, 철물조사연구 용역	74,900	32,100	107,000	
서울	종로구	보물 제142호	서울 동관왕묘	외삼문 및 외곽담장 보수	179,200	76,800	256,000	
서울	종로구	국보 제2호	서울 원각사지 십층석탑	보호각 필터교체 및 세척, 보호각철거 및 확장 신축 기본계획 수립	105,000	45,000	150,000	●
서울	종로구	보물 제1호	서울 흥인지문	철물 보존처리, 그물망 교체	21,490	9,210	30,700	
부산	금정구	보물 제434호	부산 범어사 대웅전	도림당, 강원부속채, 무여문, 명학당 단청(명학당은 전통안료 사용)	462,000	198,000	660,000	
부산	금정구	보물 제434호	부산 범어사 대웅전	대웅전 창호 보수	63,280	27,120	90,400	
부산	기장군	보물 제1771호	기장 장안사 대웅전	보수정비기본계획	49,000	21,000	70,000	

시 도	소재지	지정별	문화재명	사업내용	예산액(천원)			비고 (별도 검토)
					국비	지방비	계	
대구	달서구	보물 제1801호	대구 보성선원 목조석가여래삼존좌상 및 복장유물	보호각 단청	140,000	60,000	200,000	
대구	달성군	보물 제673호	달성 현풍 석빙고	수목정비,봉분토사 유출방지 조치	15,280	6,549	21,829	
대구	달성군	보물 제1813호	대구 용연사 목조아미타여래삼존좌상 및 복장유물	요사채 보수 설계	28,000	12,000	40,000	
대구	달성군	보물 제1814호	대구 운흥사 목조아미타여래삼존좌상	석축 보수	203,000	87,000	290,000	
대구	동구	보물 제805호	대구 복지장사 지장전	석축 및 담장보수('18년추가사업)	91,000	39,000	130,000	
대구	동구	보물 제805호	대구 복지장사 지장전	복지장사 지장전 주변 요사채 개축 설계 및 발굴조사	170,800	73,200	244,000	●
인천	강화군	보물 제179호	강화 전등사 약사전	모니터링, 배면 석축 및 배수로 정비, 기단 보수	84,000	36,000	120,000	
광주	동구	보물 제600호	광주 약사암 석조여래좌상	석축 및 배수로 정비	70,000	30,000	100,000	
광주	동구	보물 제600호	광주 약사암 석조여래좌상	공양간 보수 설계	21,000	9,000	30,000	
대전	대덕구	보물 제1829호	대전 비래사 목조비로자나불좌상	대적광전 주변 보수정비(대적광전 활주, 계단 석축, 배수로 정비)	67,200	28,800	96,000	
울산	울주군	국보 제147호	울주 천전리 각석	천전리 각석 진입도로 개설공사	231,000	99,000	330,000	
울산	울주군	보물 제370호	울주 간월사지 석조여래좌상	토지매입	5,810,000	2,490,000	8,300,000	
울산	울주군	보물 제965-2호	육경합부	안전보관시설 설치	42,000	18,000	60,000	
울산	울주군	국보 제285호	울주 대곡리 반구대 암각화	탐방로 정비공사	84,000	36,000	120,000	
울산	울산	국보 제147호	울주 천전리 각석	반구대 암각화 보존 관련 연구 용역	140,000	60,000	200,000	
울산	울산	국보 제285호	울주 대곡리 반구대 암각화	반구대 암각화 세계유산 등재 관련 홍보 시스템 구축, 세계유산 등재를 위한 고화질 동영상촬영 및 기록화 작업	420,000	180,000	600,000	
울산	울산	국보 제285호	울주 대곡리 반구대 암각화	세계유산 등재 기반 마련 학술연구용역(2차)	210,000	90,000	300,000	
울산	울산	국보 제285호	울주 대곡리 반구대 암각화	반구대 암각화 안전관리 정밀 모니터링(3D스캔 등)	140,000	60,000	200,000	
울산	울산	국보 제285호	울주 대곡리 반구대 암각화	세계유산 등재를 위한 반구대 암각화 보존관리계획 수립 용역	140,000	60,000	200,000	
세종	세종	보물 제650호	세종시 연화사 칠존불비상	요사채와 공양간 기능을 같이 하는 건물 1동, 화장실 건물 1동 건립 및 한식담장 설치	507,500	217,500	725,000	

시 도	소재지	지정별	문화재명	사업내용	예산액(천원)			비고 (별도 검토)
					국비	지방비	계	
경기	가평군	보물 제1793호	가평 현등사 동종	극락전 해체보수 설계	77,000	33,000	110,000	
경기	가평군	보물 제1793호	가평 현등사 동종	만월보전 단청 공사	119,700	51,300	171,000	
경기	동두천 시	보물 제1211호	반야바라밀다심경약소	종무소 증·개축	346,500	148,500	495,000	
경기	안성시	보물 제824호	안성 청룡사 대웅전	대웅전 해체보수	1,005,200	430,800	1,436,000	
경기	안성시	보물 제2036호	안성 칠장사 대웅전	요사채 개축 및 주변 정비	700,000	300,000	1,000,000	
경기	안성시	보물 제823호	안성 석남사 영산전	석축, 배수로 정비, 마당 포장	84,000	36,000	120,000	
경기	안양시	보물 제4호	안양 중초사지 당간지주	토지매입	773,500	331,500	1,105,000	
경기	안양시	보물 제4호	안양 중초사지 당간지주	종합정비계획 수립	70,000	30,000	100,000	
경기	양평군	보물 제531호	양평 용문사 정지국사탑 및 비	보존관리방안 연구 용역비 반영	21,000	9,000	30,000	
경기	여주시	보물 제228호	여주 신륵사 보제존자석종	시굴조사	15,400	6,600	22,000	
경기	여주시	보물 제7호	여주 고달사지 원종대사탑	모니터링	14,000	6,000	20,000	
경기	여주시	보물 제180호	여주 신륵사 조사당	적목당 해체 보수 설계비	84,630	36,270	120,900	●
경기	이천시	보물 제822호	이천 영월암 마애여래입상	정밀실측	35,000	15,000	50,000	
경기	이천시	보물 제982호	이천 장암리 마애보살반가상	정밀실측	28,000	12,000	40,000	
경기	이천시	보물 제822호	이천 영월암 마애여래입상	계단 및 석축정비	105,000	45,000	150,000	
경기	파주시	보물 제93호	파주 용미리 마애이불입상	보호책 및 석축 정비	35,000	15,000	50,000	
경기	파주시	보물 제1323호	파주 공효공 박중손묘 장명등	석물 보존처리	52,500	22,500	75,000	
경기	평택시	보물 제567호	평택 만기사 철조여래좌상	대웅전 기와 보수정비	94,500	40,500	135,000	
경기	하남시	보물 제12호	하남 동사지 오층석탑	모니터링	10,500	4,500	15,000	
경기	화성시	보물 제1942호	화성 용주사 대웅보전	홍살문 해체 보수	22,050	9,450	31,500	
경기	화성시	보물 제1942호	화성 용주사 대웅보전	요사채 건립 설계	70,000	30,000	100,000	●
강원	강릉시	보물 제85호	강릉 굴산사지 승탑	굴산사지 승탑 보존처리 및 주변정비(배수로 정비 등)	35,000	15,000	50,000	

시 도	소재지	지정별	문화재명	사업내용	예산액(천원)			비고 (별도 검토)
					국비	지방비	계	
강원	강릉시	보물 제191호	강릉 보현사 낭원대사탑	강릉 보현사 낭원대사탑 주변정비(지반정비 및 테크설치)	63,000	27,000	90,000	
강원	강릉시	국보 제124호	강릉 한송사지 석조보살좌상	한송사지 발굴조사	189,000	81,000	270,000	
강원	고성군	보물 제1336호	고성 건봉사 능파교	대웅전 지역 발굴조사	175,000	75,000	250,000	
강원	고성군	보물 제1336호	고성 건봉사 능파교	극락전복원공사(2차)	1,085,000	465,000	1,550,000	
강원	동해시	보물 제1277호	동해 삼화사 삼층석탑	삼화사지 발굴조사(2차)	210,000	90,000	300,000	
강원	동해시	보물 제1277호	동해 삼화사 삼층석탑	정밀안전진단 및 정밀실측	84,000	36,000	120,000	
강원	삼척시	보물 제213호	삼척 죽서루	삼척도호부 관아유적(객사) 복원사업(1차)	1,050,000	450,000	1,500,000	●
강원	속초시	보물 제1981호	속초 신흥사 극락보전	신흥사 선원 및 법검당 리모델링 설계용역	140,000	60,000	200,000	
강원	양양군	국보 제122호	양양 진전사지 삼층석탑	진전사지 발굴조사	259,000	111,000	370,000	
강원	양양군	국보 제122호	양양 진전사지 삼층석탑	삼층석탑 해체보수 추가 설계	21,000	9,000	30,000	●
강원	양양군	보물 제439호	양양 진전사지 도의선사탑	모니터링	14,000	6,000	20,000	
강원	양양군	보물 제444호	양양 선림원지 삼층석탑	구조모니터링 및 주변정비	49,000	21,000	70,000	
강원	양양군	보물 제445호	양양 선림원지 석등	정밀실측	35,000	15,000	50,000	
강원	영월군	보물 제612호	영월 흥녕사지 징효대사탑비	송림 소나무재선충병 방제 및 식생정비	255,500	109,500	365,000	
강원	원주시	국보 제59호	원주 법천사지 지광국사탑비	지광국사탑비 해체 및 이전공사	63,000	27,000	90,000	
강원	인제군	보물 제1275호	인제 한계사지 남 삼층석탑	정밀실측	42,189	18,081	60,270	
강원	인제군	보물 제1276호	인제 한계사지 북 삼층석탑	정밀실측	44,226	18,954	63,180	
강원	인제군	보물 제1832호	인제 봉정암 오층석탑	진법동 개축 및 배면 석축보수공사 설계용역	56,000	24,000	80,000	
강원	인제군	보물 제1832호	인제 봉정암 오층석탑	적묵당 보수공사	165,695	71,012	236,707	
강원	정선군	보물 제410호	정선 정암사 수마노탑	보수정비 기본계획(추가)	35,000	15,000	50,000	
강원	정선군	보물 제410호	정선 정암사 수마노탑	수마노탑 주변 발굴조사(4차)	210,000	90,000	300,000	
강원	춘천시	보물 제164호	춘천 청평사 회전문	회전문 지붕 보수 공사	97,790	41,910	139,700	

시 도	소재지	지정별	문화재명	사업내용	예산액(천원)			비고 (별도 검토)
					국비	지방비	계	
강원	평창군	국보 제48-1호	평창 월정사 팔각 구층석탑	동별당 리모델링 설계비	35,000	15,000	50,000	
강원	평창군	국보 제48-1호	평창 월정사 팔각 구층석탑	공양간 분전반 이설사업	63,000	27,000	90,000	
강원	화천군	보물 제496호	화천 계성리 석등	석등 보존처리	28,000	12,000	40,000	
강원	화천군	보물 제496호	화천 계성리 석등	발굴조사 및 석조물 실측	315,000	135,000	450,000	
충북	영동군	보물 제534호	영동 영국사 원각국사비	탐방로 및 배수로 정비	21,000	9,000	30,000	
충북	영동군	보물 제1371호	영동 반야사 삼층석탑	적목당 지붕보수(추가)	350,000	150,000	500,000	
충북	영동군	보물 제1371호	영동 반야사 삼층석탑	공양간, 심검당 개축 설계	103,600	44,400	148,000	
충북	영동군	보물 제1371호	영동 반야사 삼층석탑	석축 및 담장 보수, 신설 설계	32,900	14,100	47,000	
충북	옥천군	보물 제1338호	옥천 용암사 동·서 삼층석탑	석축 및 배수로 정비	210,000	90,000	300,000	
충북	제천시	보물 제459호	제천 장락동 칠층모전석탑	유구 정비	280,000	120,000	400,000	
충북	진천군	보물 제404호	진천 연곡리 석비	배수체계 정비, 수목 정비	42,000	18,000	60,000	
충북	진천군	보물 제1551호	진천 영수사 영산회괘불탱	보호각 보수	189,000	81,000	270,000	
충북	청주시	보물 제1941호	청주 비중리 석조여래삼존상 및 석조여래입상	토지매입 및 정비	700,000	300,000	1,000,000	
충북	청주시	보물 제1941호	청주 비중리 석조여래삼존상 및 석조여래입상	정밀실측	69,160	29,640	98,800	
충북	청주시	보물 제1941호	청주 비중리 석조여래삼존상 및 석조여래입상	발굴조사	280,000	120,000	400,000	
충북	청주시	보물 제664호	청주 안심사 대웅전	종무소 개축	529,200	226,800	756,000	
충북	충주시	보물 제96호	충주 미륵리 석조여래입상	보호석실 해체보수	1,540,000	660,000	2,200,000	
충북	충주시	보물 제1401호	충주 봉황리 마애불상군	배수로, 석축, 계단, 수목 등 주변정비, 토지매입	140,000	60,000	200,000	
충북	충주시	보물 제95호	충주 미륵리 오층석탑	정밀실측	56,000	24,000	80,000	
충북	충주시	국보 제197호	충주 청룡사지 보각국사탑	정밀실측	49,000	21,000	70,000	
충북	충주시	보물 제17호	충주 정토사지 법경대사탑비	정밀실측	42,000	18,000	60,000	

시 도	소재지	지정별	문화재명	사업내용	예산액(천원)			비고 (별도 검토)
					국비	지방비	계	
충북	충주시	보물 제16호	충주 역정사지 대지국사탑비	정밀실측	28,000	12,000	40,000	
충남	공주시	보물 제256호	공주 갑사 철당간	수목정비	21,000	9,000	30,000	
충남	공주시	보물 제1293호	공주 계룡산 중악단	영원전 지붕보수 및 매표소 단청	162,151	69,494	231,645	
충남	공주시	국보 제298호	갑사삼신불괘불탱	진해당 보수정비	203,000	87,000	290,000	
충남	논산시	보물 제1746호	논산 노강서원 강당	노강서원 강당 보수정비사업	560,000	240,000	800,000	
충남	논산시	보물 제408호	논산 쌍계사 대웅전	석축, 배수로 정비	105,000	45,000	150,000	
충남	논산시	보물 제408호	논산 쌍계사 대웅전	목부재 충해조사 및 조치	35,000	15,000	50,000	
충남	논산시	보물 제408호	논산 쌍계사 대웅전	벽화및단청기록화, 보존처리, 벽체보수, 경비관제소 개축	196,000	84,000	280,000	
충남	당진시	보물 제987호	당진 신암사 금동여래좌상	화장실 모로단청	22,400	9,600	32,000	
충남	보령시	보물 제19호	보령 성주사지 오층석탑	모니터링, 보존처리	49,000	21,000	70,000	
충남	부여군	보물 제356호	부여 무량사 극락전	석축, 담장 정비	70,000	30,000	100,000	
충남	부여군	보물 제185호	부여 무량사 오층석탑	모니터링	7,000	3,000	10,000	
충남	부여군	보물 제185호	부여 무량사 오층석탑	진입교량(홍예교) 건립 설계	28,000	12,000	40,000	●
충남	부여군	보물 제217호	부여 대조사 석조미륵보살입상	단청	63,000	27,000	90,000	
충남	서산시	국보 제84호	서산 용현리 마애여래삼존상	주변 암반 정밀안전진단	70,000	30,000	100,000	
충남	서산시	국보 제84호	서산 용현리 마애여래삼존상	테크보수, 수목정비	140,000	60,000	200,000	
충남	서산시	보물 제1976호	서산 명종대왕 태실 및 비	정밀실측, 보존처리 및 보수	105,000	45,000	150,000	
충남	서천군	보물 제224호	서천 성북리 오층석탑	보존처리	56,000	24,000	80,000	
충남	아산시	보물 제536호	아산 평촌리 석조약사여래입상	지지석, 바닥, 계단 보수	21,000	9,000	30,000	
충남	아산시	보물 제537호	아산 읍내동 당간지주	토지매입	1,400,000	600,000	2,000,000	
충남	아산시	보물 제1960호	불설대보부모은중경 (언해) 목판	세심사 대응전 증개축 설계	61,600	26,400	88,000	
충남	예산군	국보 제49호	예산 수덕사 대웅전	관람편의시설(화장실) 개축	350,000	150,000	500,000	

시 도	소재지	지정별	문화재명	사업내용	예산액(천원)			비고 (별도 검토)
					국비	지방비	계	
충남	예산군	국보 제49호	예산 수덕사 대웅전	주변정비(명부전 주변 담장, 석축 정비, 대웅전 기단바닥 정비, 창고 철거, 경비관제소 단청)	152,950	65,550	218,500	
충남	예산군	국보 제49호	예산 수덕사 대웅전	난간 설치 및 계단 해체보수 설계	21,000	9,000	30,000	
충남	천안시	보물 제1261호	광덕사노사나불괘불탱	공양간 건립	725,900	311,100	1,037,000	
충남	천안시	보물 제1261호	광덕사노사나불괘불탱	고경당 증개축 설계	45,500	19,500	65,000	
충남	천안시	보물 제354호	천안 천흥사지 오층석탑	시발굴조사	162,400	69,600	232,000	
충남	천안시	국보 제7호	천안 봉선흥경사 갈기비	정비계획 수립	28,000	12,000	40,000	
충남	홍성군	보물 제1262호	용봉사영산회괘불탱	공양간 증·개축(적묵당 연계 보수)	571,109	244,761	815,870	
충남	홍성군	보물 제538호	홍성 오관리 당간지주	주변 정비 설계	14,000	6,000	20,000	
충남	홍성군	보물 제355호	홍성 신경리 마애여래입상	보존처리, 보호책 설치	10,500	4,500	15,000	
전북	고창군	보물 제279호	고창 선운사 금동지장보살좌상	보호각 단청	148,400	63,600	212,000	
전북	고창군	보물 제290호	고창 선운사 대웅전	모니터링	21,000	9,000	30,000	
전북	고창군	보물 제803호	고창 선운사 참당암 대웅전	벽화, 후불탱화 보존처리	210,000	90,000	300,000	
전북	김제시	보물 제1833호	김제 청룡사 목조관음보살좌상	석축 설치	525,000	225,000	750,000	
전북	김제시	보물 제827호	김제 금산사 대장전	지붕보수	14,000	6,000	20,000	
전북	김제시	보물 제25호	김제 금산사 오층석탑	유물전시관 지붕보수	12,000	28,000	40,000	
전북	남원시	보물 제942호	황진가 고문서	전시관 담장 신설	18,000	42,000	60,000	
전북	남원시	보물 제31호	남원 만복사지 석조대좌	보존처리	21,000	9,000	30,000	
전북	남원시	보물 제37호	남원 실상사 동·서 삼층석탑	계측 모니터링	14,000	6,000	20,000	
전북	남원시	보물 제1517호	남원 선국사 건칠아미타여래좌상 및 복장유물	공양간 건립 설계	26,600	11,400	38,000	
전북	부안군	보물 제292호	부안 개암사 대웅전	대웅보전 우물마루 및 수미단 보수	91,000	39,000	130,000	
전북	부안군	보물 제277호	부안 내소사 동종	수장고 건립 설계	70,000	30,000	100,000	

시 도	소재지	지정별	문화재명	사업내용	예산액(천원)			비고 (별도 검토)
					국비	지방비	계	
전북	부안군	보물 제291호	부안 내소사 대웅보전	단청 보존처리 타당성조사	35,000	15,000	50,000	
전북	부안군	보물 제291호	부안 내소사 대웅보전	배수로 정비	182,000	78,000	260,000	
전북	부안군	보물 제739호	고회 초상 및 문중유물	전시관 향온향습기 및 조명시설 교체	4,200	9,800	14,000	
전북	완주군	보물 제1243호	완주 송광사 대웅전	단청기록화, 중요 단청 모사도 제작	140,000	60,000	200,000	
전북	완주군	보물 제1434호	완주 안심사 금강계단	석물 보존처리	49,000	21,000	70,000	
전북	완주군	보물 제662호	완주 화암사 우회루	석축 정비	53,659	22,996	76,655	
전북	익산시	보물 제1842호	익산 관음사 목조보살입상	보호각 건립 및 담장 설치	1,050,000	450,000	1,500,000	
전북	익산시	보물 제825호	익산 승림사 보광전	석축, 기단 등 정비	56,000	24,000	80,000	
전북	익산시	보물 제651호	연안이씨 종중 문적	전시관 육각정 보수	45,000	105,000	150,000	
전북	익산시	보물 제1890호	익산 심곡사 칠층석탑 출토 금동불감 및 금동아미타여래칠존좌상	수장고 건립	840,000	360,000	1,200,000	
전북	장수군	보물 제272호	장수향교 대성전	대성전 기단, 사마제 구들 및 굴뚝 등 보수	70,000	30,000	100,000	
전북	전주시	보물 제1578호	전주 경기전 정전	모니터링	15,400	6,600	22,000	
전북	전주시	보물 제1578호	전주 경기전 정전	배수체계 정비	70,000	30,000	100,000	
전북	전주시	보물 제583호	전주 풍패지관	서익헌 해체보수	350,100	150,043	500,143	
전북	전주시	보물 제583호	전주 풍패지관	발굴조사	103,600	44,400	148,000	
전북	정읍시	보물 제1181호	태인고현동향약	담장보수 및 주변정비	69,300	29,700	99,000	
전북	정읍시	보물 제289호	정읍 피향정	계자난간 및 마루판 보수	16,800	7,200	24,000	
전남	강진군	국보 제13호	강진 무위사 극락보전	대체범당 건립 설계	133,000	57,000	190,000	●
전남	강진군	보물 제1312호	강진 무위사 아미타여래삼존좌상	명경당 배면 석축 및 배수로 정비	182,000	78,000	260,000	
전남	강진군	보물 제1843호	강진 정수사 석가여래삼불좌상	석축 및 교량 정비 설계	49,000	21,000	70,000	
전남	강진군	보물 제1841호	강진 고성사 청동보살좌상	관음전 건립 설계	28,000	12,000	40,000	
전남	고흥군	보물 제1307호	고흥 능가사 대웅전	석축, 배수로, 담장 정비	350,000	150,000	500,000	

시 도	소재지	지정별	문화재명	사업내용	예산액(천원)			비고 (별도 검토)
					국비	지방비	계	
전남	고흥군	보물 제1307호	고흥 능가사 대웅전	지붕보수	35,000	15,000	50,000	
전남	고흥군	보물 제1557호	고흥 능가사 동종	관리소 증·개축	175,000	75,000	250,000	
전남	곡성군	보물 제273호	곡성 태안사 적인선사탑	시발굴 조사	35,000	15,000	50,000	
전남	곡성군	보물 제274호	곡성 태안사 광자대사탑	진입로 석축 정비	29,400	12,600	42,000	
전남	곡성군	보물 제274호	곡성 태안사 광자대사탑	하천석축정비	126,000	54,000	180,000	
전남	곡성군	보물 제1349호	곡성 태안사 동종	세심당 개축 설계	49,000	21,000	70,000	
전남	곡성군	보물 제273호	곡성 태안사 적인선사탑	조륜청정탑비 보존처리	14,000	6,000	20,000	
전남	광양시	보물 제112호	광양 중흥산성 삼층석탑	배수체계 정비	70,000	30,000	100,000	
전남	구례군	국보 제35호	구례 화엄사 사사자 삼층석탑	석탑 해체보수	455,000	195,000	650,000	
전남	구례군	국보 제35호	구례 화엄사 사사자 삼층석탑	탑전 단청 반영	476,000	204,000	680,000	
전남	구례군	보물 제299호	구례 화엄사 대웅전	계곡부 안전시설 설치	245,000	105,000	350,000	
전남	구례군	국보 제67호	구례 화엄사 각황전	단청 기록화	189,000	81,000	270,000	
전남	구례군	국보 제301호	화엄사영산회괘불탱	전시관 수장시설 리모델링	57,600	134,400	192,000	
전남	구례군	보물 제1040호	구례화엄사화엄석경	화엄사 화엄석경 보호각 건립	2,240,000	960,000	3,200,000	
전남	구례군	보물 제154호	구례 연곡사 소요대사탑	석축, 계단, 배수로 정비	210,000	90,000	300,000	
전남	구례군	보물 제153호	구례 연곡사 동 승탑비	종각 모로 단청(전통안료사용)	84,000	36,000	120,000	
전남	구례군	보물 제151호	구례 연곡사 삼층석탑	석탑 주변 배수체계 정비	70,000	30,000	100,000	
전남	구례군	보물 제924호	천은사극락전아미타후 불탱화	유물수장고 건립	1,400,000	600,000	2,000,000	
전남	구례군	보물 제924호	천은사극락전아미타후 불탱화	내부개보수	203,000	87,000	290,000	
전남	구례군	보물 제2024호	구례 천은사 극락보전	수홍루 콘크리트교량 정비	252,000	108,000	360,000	
전남	구례군	보물 제584호	구례 윤문효공 신도비	석축, 배수로 정비 등	140,000	60,000	200,000	
전남	나주시	보물 제462호	나주 철천리 석조여래입상	보호각 건립	350,000	150,000	500,000	

시 도	소재지	지정별	문화재명	사업내용	예산액(천원)			비고 (별도 검토)
					국비	지방비	계	
전남	나주시	보물 제1545호	나주 불회사 건칠비로자나불좌상	명부전 해체보수	420,000	180,000	600,000	
전남	나주시	보물 제1343호	다보사괘불탱	천불전 이축	350,000	150,000	500,000	
전남	나주시	보물 제1279호	죽림사세존괘불탱	문화재 보관시설 설치	84,000	36,000	120,000	
전남	나주시	보물 제1310호	나주 불회사 대웅전	단청 보수	105,000	45,000	150,000	
전남	나주시	보물 제2037호	나주 금성관	보수정비기본계획수립	35,000	15,000	50,000	●
전남	담양군	보물 제111호	담양 개선사지 석등	발굴조사	256,900	110,100	367,000	
전남	담양군	보물 제505호	담양 객사리 석당간	보존처리	126,000	54,000	180,000	
전남	담양군	보물 제1555호	담양 용흥사 동종	공양간 내·외부 보수 공사	175,000	75,000	250,000	
전남	담양군	보물 제737호	불조역대통계	수장고 건립	378,000	162,000	540,000	
전남	담양군	보물 제260호	유회춘 미암일기 및 미암집목판	전시관 향온항습기 교체	14,700	34,300	49,000	
전남	목포시	보물 제2011호	목포 달성사 목조지장보살삼존상 및 시왕상 일괄	명부전 기단보수 등 주변정비 공사	43,050	18,450	61,500	
전남	보성군	보물 제944호	보성 유신리 마애여래좌상	보호각 단청 및 석축 보수	273,000	117,000	390,000	
전남	여수시	국보 제304호	여수 진남관	진남관 해체보수	3,150,000	1,350,000	4,500,000	
전남	여수시	보물 제396호	여수 흥국사 대웅전	사천왕상 보수	7,000	3,000	10,000	
전남	여수시	보물 제396호	여수 흥국사 대웅전	마당 포장	105,000	45,000	150,000	
전남	여수시	보물 제571호	여수 통제이공 수군대첩비	종합정비 기본계획 수립	56,000	24,000	80,000	
전남	영광군	보물 제830호	영광 불갑사 대웅전	벽화 보존처리	210,000	90,000	300,000	
전남	영광군	보물 제830호	영광 불갑사 대웅전	기단, 마루, 창호 철물 등 보수	196,000	84,000	280,000	
전남	영광군	보물 제830호	영광 불갑사 대웅전	각진국사비 보수정비	24,500	10,500	35,000	
전남	영광군	보물 제830호	영광 불갑사 대웅전	단청	350,000	150,000	500,000	
전남	영광군	보물 제830호	영광 불갑사 대웅전	관음전 건립 설계	30,800	13,200	44,000	●
전남	영암군	보물 제89호	영암 도갑사 석조여래좌상	미륵전 진입로 정비	70,000	30,000	100,000	

시 도	소재지	지정별	문화재명	사업내용	예산액(천원)			비고 (별도 검토)
					국비	지방비	계	
전남	영암군	보물 제1283호	영암 월출산 용암사지 삼층석탑	발굴조사	182,000	78,000	260,000	
전남	영암군	보물 제1283호	영암 월출산 용암사지 삼층석탑	자연석 석축설치 및 기반보수	28,000	12,000	40,000	
전남	영암군	보물 제1118호	영암 성풍사지 오층석탑	정밀안전진단	35,000	15,000	50,000	
전남	영암군	보물 제594호	최덕지초상및유지초본	동채해체보수 및 석축 정비 설계	31,500	13,500	45,000	
전남	장성군	보물 제1346호	장성 백양사 소요대사탑	오백나한전 추정지 시발굴조사	42,000	18,000	60,000	
전남	장성군	보물 제1346호	장성 백양사 소요대사탑	수장고 보수	560,000	240,000	800,000	
전남	장성군	보물 제1346호	장성 백양사 소요대사탑	학예연구동 이축 설계비	35,000	15,000	50,000	
전남	장흥군	보물 제795호	장흥 천관사 삼층석탑	청풍당 개축	539,000	231,000	770,000	
전남	장흥군	보물 제795호	장흥 천관사 삼층석탑	해우소 내부 개보수	49,000	21,000	70,000	
전남	장흥군	국보 제44호	장흥 보림사 남·북 삼층석탑 및 석등	정밀실측	59,890	25,667	85,557	
전남	해남군	보물 제947호	해남 미황사 대웅전	대웅전 해체보수	1,960,000	840,000	2,800,000	
전남	해남군	보물 제947호	해남 미황사 대웅전	달마전 보수 설계	35,000	15,000	50,000	
전남	해남군	보물 제1183호	해남 미황사 응진당	영선실 개축	140,000	60,000	200,000	●
전남	해남군	보물 제1715호	해남 서동사 목조석가여래삼불좌상	공양간 건립 설계	63,000	27,000	90,000	
전남	해남군	국보 제308호	해남 대흥사 북미륵암 마애여래좌상	보호각 정비(2차)	112,000	48,000	160,000	
전남	화순군	보물 제1116호	화순 유마사 해련탑	대웅전 기와고르기	28,000	12,000	40,000	
전남	화순군	보물 제1116호	화순 유마사 해련탑	담장 정비	56,000	24,000	80,000	
전남	화순군	보물 제798호	화순 운주사 원형 다층석탑	진동 조사, 모니터링	15,400	6,600	22,000	
전남	화순군	보물 제796호	화순 운주사 구층석탑	지반 및 배수체계 정비, 기초암반 하부 보강	70,000	30,000	100,000	
전남	화순군	보물 제797호	화순 운주사 석조불감	보수정비 기본계획	49,000	21,000	70,000	
전남	화순군	보물 제1345호	만연사괘불탱	요사채 단청	122,500	52,500	175,000	
경북	경산시	보물 제431호	경산 팔공산 관봉 석조여래좌상	정밀실측	56,000	24,000	80,000	

시 도	소재지	지정별	문화재명	사업내용	예산액(천원)			비고 (별도 검토)
					국비	지방비	계	
경북	경산시	보물 제429호	경산 불굴사 삼층석탑	요사채 개축 설계	28,000	12,000	40,000	
경북	경주시	보물 제1188호	경주 남산 천룡사지 삼층석탑	복발 고층 및 상륜부 복원 연구용역	10,500	4,500	15,000	
경북	경주시	보물 제1727호	경주향교 대성전	동무, 서무 보수 및 대성전 앞마당 포장	84,000	36,000	120,000	
경북	경주시	보물 제1977호	경주 방형대좌 석조여래좌상	시굴 및 발굴조사	140,000	60,000	200,000	
경북	경주시	국보 제30호	경주 분황사 모전석탑	전탑 보존처리, 기단석축 보수	105,000	45,000	150,000	
경북	경주시	보물 제62호	경주 서악동 마애여래삼존입상	정밀모니터링 및 주변환경평가 등	231,000	99,000	330,000	
경북	경주시	보물 제1928호	경주 미탄사지 삼층석탑	발굴조사	350,000	150,000	500,000	
경북	경주시	보물 제126호	경주 무장사지 삼층석탑	모니터링, 주변정비(수목, 배수체계, 정비)	49,000	21,000	70,000	
경북	경주시	보물 제581호	경주 골굴암 마애여래좌상	보존처리 계획 수립(설계도서 작성 포함)	14,000	6,000	20,000	
경북	경주시	보물 제125호	경주 무장사지 아미타불 조상 사적비	보존처리, 배수체계 정비	63,000	27,000	90,000	
경북	경주시	국보 제312호	경주 남산 칠불암 마애불상군	석축정비	210,000	90,000	300,000	
경북	경주시	보물 제1935호	경주 남산 용장계 지곡 제3사지 삼층석탑	보존처리, 주변정비	84,000	36,000	120,000	
경북	경주시	보물 제66호	경주 석빙고	보존처리(이끼류, 지의류 제거, 균열부 접착), 바닥흙포설	56,000	24,000	80,000	
경북	경주시	국보 제199호	경주 단석산 신선사 마애불상군	정기계측	15,400	6,600	22,000	
경북	경주시	보물 제442호	경주 양동 관가정	관가정 도리이상 해체보수	140,000	60,000	200,000	
경북	경주시	보물 제413호	경주 독락당	협문 보수, 어서각 주변정비, 청판보수, 살창이건	98,000	42,000	140,000	
경북	경주시	보물 제413호	경주 독락당	향온항습기 교체	15,000	35,000	50,000	
경북	경주시	보물 제124호	경주 남산동 동·서 삼층석탑	석탑 보존처리	105,000	45,000	150,000	
경북	고령군	보물 제605호	고령 장기리 암각화	보호각 설계	35,000	15,000	50,000	●
경북	구미시	보물 제492호	구미 해평리 석조여래좌상	보존처리	19,600	8,400	28,000	
경북	구미시	보물 제469호	구미 낙산리 삼층석탑	지표조사	2,800	1,200	4,000	
경북	구미시	보물 제469호	구미 낙산리 삼층석탑	보존처리계획(설계도서 작성 포함), 주변정비	42,000	18,000	60,000	

시 도	소재지	지정별	문화재명	사업내용	예산액(천원)			비고 (별도 검토)
					국비	지방비	계	
경북	구미시	보물 제1945호	구미 대둔사 대웅전	단청 기록화, 단청 보존처리	175,000	75,000	250,000	
경북	구미시	보물 제1012호	몽산화상법어약록(인해)	외편 담장 설치	56,000	24,000	80,000	
경북	군위군	국보 제109호	군위 아미타여래삼존 석굴	주변정비 및 진입계단 보수	245,000	105,000	350,000	
경북	김천시	보물 제606호	문경 도천사지 동·서 삼층석탑	보존처리	63,000	27,000	90,000	
경북	김천시	보물 제607호	문경 도천사지 삼층석탑	보존처리	31,500	13,500	45,000	
경북	김천시	보물 제1576호	김천 직지사 대웅전	외부 벽화 보존처리, 정밀안전진단 필요	105,000	45,000	150,000	
경북	김천시	보물 제1186호	(전)구미 강락사지 삼층석탑	유물수장고 건립	1,750,000	750,000	2,500,000	●
경북	김천시	보물 제1854호	김천 고방사 아미타여래설법도	설법전 및 공양간 개축 설계	84,000	36,000	120,000	
경북	문경시	보물 제1640호	문경 김룡사 영산회괘불도	극락전, 응진전 주변 석축 및 응진전 담장 정비	101,500	43,500	145,000	
경북	문경시	보물 제1640호	문경 김룡사 영산회괘불도	보제루, 향하당 지붕 보수	122,500	52,500	175,000	
경북	문경시	보물 제1574호	문경 봉암사 극락전	경비관제소 개축	350,000	150,000	500,000	
경북	문경시	보물 제172호	문경 봉암사 정진대사탑비	요사채 개축	700,000	300,000	1,000,000	
경북	문경시	보물 제169호	문경 봉암사 삼층석탑	석축 보수	81,200	34,800	116,000	
경북	문경시	보물 제51호	문경 내화리 삼층석탑	모니터링	10,500	4,500	15,000	
경북	문경시	보물 제1640호	문경 김룡사 영산회괘불도	상선원 보수 및 배면 석축정비 설계	26,600	11,400	38,000	
경북	문경시	국보 제321호	문경 대승사 목각아미타여래설법상	대웅전 창호 및 주변 석축, 배수로 정비	155,400	66,600	222,000	
경북	문경시	보물 제1634호	문경 대승사 금동아미타여래좌상 및 복장유물	충지암 보수 설계	35,000	15,000	50,000	
경북	봉화군	국보 제201호	봉화 북지리 마애여래좌상	극락전 단청	84,000	36,000	120,000	
경북	봉화군	보물 제995호	봉화 축서사 석조비로자나불좌상 및 목조광배	우물반자 및 단집 보존처리	105,000	45,000	150,000	
경북	상주시	보물 제922호	상주 남장사 보광전 목각아미타여래설법상	금륜전, 진영각 보수 설계	30,100	12,900	43,000	
경북	상주시	보물 제120호	상주 증춘리 석조여래좌상	석불 이전 타당성 검토 용역, 시굴조사	70,000	30,000	100,000	●

시 도	소재지	지정별	문화재명	사업내용	예산액(천원)			비고 (별도 검토)
					국비	지방비	계	
경북	상주시	보물 제1568호	상주 양진당	양진당 해체보수	210,000	90,000	300,000	
경북	상주시	보물 제923호	상주 남장사 관음선원 목각아미타여래설법상	관음선원 단청 및 해탈문 보수정비 설계	35,000	15,000	50,000	
경북	성주군	보물 제1121호	성주 금봉리 석조비로자나불좌상	보존처리	35,000	15,000	50,000	
경북	성주군	보물 제1656호	성주 범수사지 삼층석탑	토지매입	161,945	69,405	231,350	
경북	성주군	보물 제1656호	성주 범수사지 삼층석탑	석축 보수	210,000	90,000	300,000	
경북	성주군	보물 제1575호	성주향교 대성전 및 명륜당	명륜당 해체보수	91,000	39,000	130,000	
경북	안동시	보물 제58호	안동 안기동 석조여래좌상	주변정비(담장, 험문, 약사전, 마당 정비)	35,000	15,000	50,000	
경북	안동시	보물 제115호	안동 이천동 마애여래입상	보존처리	77,000	33,000	110,000	
경북	안동시	보물 제57호	안동 조탑리 오층전탑	조탑리 오층전탑 해체보수	350,000	150,000	500,000	
경북	안동시	보물 제1571호	안동 보광사 목조관음보살좌상 및 복장유물	담장 및 석축 설치	175,000	75,000	250,000	
경북	안동시	보물 제182호	안동 임청각	실시설계 용역, 지표조사, 시,발굴 조사, 건축물 철거	1,610,000	690,000	2,300,000	●
경북	안동시	보물 제450호	안동 의성김씨 종택	해체보수 공사	1,155,000	495,000	1,650,000	
경북	영양군	보물 제610호	영양 현리 삼층석탑	배수로 정비	31,500	13,500	45,000	
경북	영주시	보물 제680호	영주 신암리 마애여래삼존상	주변정비사업(석축, 배수로,보호각 보수)	43,400	18,600	62,000	
경북	영주시	보물 제681호	영주 흑석사 석조여래좌상	심검당 단청(전통안료 사용)	203,000	87,000	290,000	
경북	영주시	보물 제681호	영주 흑석사 석조여래좌상	석조여래좌상 학술연구	21,000	9,000	30,000	●
경북	영주시	보물 제1005호	장말손 증가 고문서	유물수장고 건립 설계	31,360	13,440	44,800	
경북	영천시	보물 제616호	영천향교 대성전	삼일제 보수	84,000	36,000	120,000	
경북	영천시	보물 제1271호	수도사노사나불괘불탱	화장실 증·개축	140,000	60,000	200,000	
경북	영천시	보물 제521호	영천 승렬당	외삼문 지붕보수	28,000	12,000	40,000	
경북	예천군	보물 제53호	예천 개심사지 오층석탑	토지매입, 종합정비계획 수립	1,120,000	480,000	1,600,000	
경북	예천군	보물 제53호	예천 개심사지 오층석탑	보존처리	24,500	10,500	35,000	

시 도	소재지	지정별	문화재명	사업내용	예산액(천원)			비고 (별도 검토)
					국비	지방비	계	
경북	예천군	보물 제424호	예천 청룡사 석조여래좌상	법당 개축 설계 용역	56,000	24,000	80,000	●
경북	예천군	보물 제1445호	예천용문사영산회괘불탱	보호각 건립	560,000	240,000	800,000	
경북	예천군	보물 제1917호	예천 야옹정	해체보수	518,000	222,000	740,000	
경북	예천군	보물 제426호	예천 동본리 삼층석탑	보존처리	14,000	6,000	20,000	
경북	예천군	보물 제427호	예천 동본리 석조여래입상	보존처리 및 주변정비	30,100	12,900	43,000	
경북	청도군	보물 제836호	청도 대적사 극락전	시굴조사	21,000	9,000	30,000	
경북	청도군	보물 제1957호	청도 대비사 영산회상도	보호각 건립 설계	35,000	15,000	50,000	
경북	청송군	보물 제1570호	청송 대전사 보광전	시굴조사	30,100	12,900	43,000	
경북	청송군	보물 제1570호	청송 대전사 보광전	교량 설치 설계	42,000	18,000	60,000	●
경북	청송군	보물 제1840호	청송 보광사 극락전	화장실 건립	154,000	66,000	220,000	
경북	칠곡군	보물 제510호	칠곡 기성리 삼층석탑	발굴조사	280,000	120,000	400,000	
경북	칠곡군	보물 제655호	칠곡 노석리 마애불상군	주변 암반 정밀안전진단	35,000	15,000	50,000	
경북	포항시	보물 제252호	포항 보경사 원진국사비	화장실 개축	175,000	75,000	250,000	
경남	거창군	보물 제1436호	거창 농산리 석조여래입상	진입로 정비사업	25,200	10,800	36,000	
경남	거창군	보물 제1436호	거창 농산리 석조여래입상	지표조사	14,000	6,000	20,000	
경남	거창군	보물 제378호	거창 상림리 석조보살입상	지표조사	14,000	6,000	20,000	
경남	고성군	보물 제1317호	운흥사괘불탱및계	공양간 개축 및 보광전 해체보수(추가분)	343,000	147,000	490,000	
경남	남해군	보물 제1849호	남해 용문사 대웅전	모니터링및정밀안전진단용역	49,000	21,000	70,000	
경남	남해군	보물 제1446호	남해용문사괘불탱	향적당 이축 설계 및 주변 석축 정비공사	224,000	96,000	320,000	
경남	밀양시	보물 제147호	밀양 영남루	영남루 주변 정비	350,000	150,000	500,000	
경남	밀양시	보물 제493호	밀양 무봉사 석조여래좌상	대웅전 배면 석축 정비	196,000	84,000	280,000	
경남	밀양시	보물 제468호	밀양 송진리 삼층석탑	3D스캔 및 풍화도 조사	15,400	6,600	22,000	

시 도	소재지	지정별	문화재명	사업내용	예산액(천원)			비고 (별도 검토)
					국비	지방비	계	
경남	밀양시	보물 제312호	밀양 소태리 오층석탑	3D스캔 및 풍화도 조사	15,400	6,600	22,000	
경남	밀양시	보물 제467호	밀양 표충사 삼층석탑	공양간 및 종각 보수 설계용역	63,000	27,000	90,000	
경남	산청군	보물 제1112호	산청 대원사 다층석탑	명부전 지붕 보수공사	98,000	42,000	140,000	
경남	산청군	보물 제1112호	산청 대원사 다층석탑	봉상루 보수정비 설계	70,000	30,000	100,000	
경남	산청군	보물 제374호	산청 율곡사 대웅전	요사채 개축, 탕화 보관소 보수	96,600	41,400	138,000	
경남	산청군	국보 제233-1호	산청 석남암사지 석조비로자나불좌상	내원사 대웅전 위치 고증 및 시굴조사 연구용역	35,000	15,000	50,000	
경남	산청군	보물 제72호	산청 단속사지 동 삼층석탑	단속사지 시굴조사	21,000	9,000	30,000	
경남	양산시	보물 제1120호	양산 신흥사 대광전	대광전 마루 및 기단보수공사	119,000	51,000	170,000	
경남	양산시	보물 제1120호	양산 신흥사 대광전	감로당 단청공사	175,000	75,000	250,000	
경남	양산시	보물 제738호	문수사리보살최상승무 생계경	통도사 수장고 건립 및 주변정비 설계	280,000	120,000	400,000	●
경남	진주시	보물 제371호	산청 사월리 석조여래좌상	정밀실측	28,000	12,000	40,000	
경남	진주시	보물 제372호	진주 용암사지 승탑	정밀실측	28,000	12,000	40,000	
경남	진주시	보물 제1686호	진주 월명암 목조아미타여래좌상	대웅전, 공양간, 요사채 보수 공사	140,000	60,000	200,000	
경남	진주시	보물 제1687호	진주 응석사 목조석가여래삼불좌상	독성각·요사채 지붕보수, 독성각 단청공사, 종각 보수 공사, 요사채 배수로 보수	171,500	73,500	245,000	
경남	창녕군	보물 제310호	창녕 석빙고	모니터링	24,948	10,692	35,640	
경남	창녕군	국보 제34호	창녕 술정리 동 삼층석탑	모니터링	13,860	5,940	19,800	
경남	창녕군	보물 제520호	창녕 술정리 서 삼층석탑	토지매입	21,000	9,000	30,000	
경남	창녕군	보물 제520호	창녕 술정리 서 삼층석탑	삼층석탑 해체보수공사(추가)	105,000	45,000	150,000	
경남	창녕군	보물 제212호	창녕 관룡사 대웅전	모니터링	15,400	6,600	22,000	
경남	창녕군	보물 제146호	창녕 관룡사 약사전	약사전 해체 보수(1차)	350,000	150,000	500,000	●
경남	창녕군	보물 제212호	창녕 관룡사 대웅전	대웅전 주변 배수로 및 등산로 정비	70,000	30,000	100,000	
경남	창녕군	보물 제212호	창녕 관룡사 대웅전	고불당 단청	70,000	30,000	100,000	

시 도	소재지	지정별	문화재명	사업내용	예산액(천원)			비고 (별도 검토)
					국비	지방비	계	
경남	하동군	보물 제500호	하동 쌍계사 대웅전	벽화 보존을 위한 기본계획 수립 및 임시 보관시설 설치	105,000	45,000	150,000	
경남	하동군	보물 제1364호	쌍계사 대웅전 삼세불탱	성보박물관 1층 리모델링 설계	21,000	49,000	70,000	
경남	하동군	보물 제500호	하동 쌍계사 대웅전	주차장 화장실 건립 설계	35,000	15,000	50,000	
경남	함안군	보물 제71호	함안 대산리 석조삼존상	발굴조사	371,000	159,000	530,000	
경남	함안군	보물 제159호	함안 방어산 마애약사여래삼존입상	정밀실측	42,000	18,000	60,000	
경남	함양군	보물 제1691호	함양 법인사 목조아미타여래좌상	극락보전 단청	196,000	84,000	280,000	
경남	함양군	보물 제474호	함양 벽송사 삼층석탑	석축 공사(잔여공사 및 4구간) 및 벽송선원 단청(전통안료 사용)	280,000	120,000	400,000	
경남	합천군	보물 제129호	합천 월광사지 동·서 삼층석탑	발굴조사	140,000	60,000	200,000	
경남	합천군	보물 제1300호	합천 해인사 흥제암	요사채 단청공사	140,000	60,000	200,000	
경남	합천군	보물 제253호	합천 청량사 석등	무제당 단청(전통안료 사용)	175,000	75,000	250,000	
제주	제주	보물 제1187호	제주 불탑사 오층석탑	담장 일부구간 부분 보수	70,000	30,000	100,000	
제주	제주	보물 제1902호	제주향교 대성전	충효관 정비	245,000	105,000	350,000	

[붙임2]

2020년도 세계유산 보존관리 국고보조사업 현황

시 도	소재지	지정별	문화재명	사업내용	예산액(천원)			비고 (별도 검토)
					국비	지방비	계	
충북	보은군	보물 제1413호	보은 범주사 철술	보은 범주사 철술 보호각 보수	147,000	63,000	210,000	
충북	보은군	보물 제915호	보은 범주사 대웅보전	보은 범주사 대웅보전 기와 변화	560,000	240,000	800,000	
충북	보은군	국보 제64호	보은 범주사 석련지	보은 범주사 석련지 보호각 보수	105,000	45,000	150,000	
충남	공주시	보물 제802호	공주 마곡사 대웅보전	마곡사대광보전보수 (벽화보존처리, 사천왕문보수, 사천왕 상보존처리, 정보문화재정밀기록화및 보존처리계획수립)	301,500	129,214	430,714	
충남	공주시	보물 제801호	공주 마곡사 대웅보전	마곡사대웅보전주변정비 (대웅보전정비및연화당보수포함)	119,000	51,000	170,000	

시 도	소재지	지정별	문화재명	사업내용	예산액(천원)			비고 (별도 검토)
					국비	지방비	계	
충남	공주시	보물 제800호	공주 마곡사 영산전	마곡사영산전주변보수정비 (대원암개축, 영은암보수, 진입로정비, 금어원건립)	1,270,000	544,200	1,814,200	
충남	공주시	보물 제800호	공주 마곡사 영산전	마곡사 안내관 정비사업	98,000	42,000	140,000	
전남	해남군	사적 제508호	해남 대흥사	성보박물관(수장고)단청	140,000	60,000	200,000	
경북	경주시	보물 제442호	경주 양동 관가정	화장실 이전 개축	70,000	30,000	100,000	
경북	경주시	보물 제412호	경주 양동 향단	향단 내부 보수	105,000	45,000	150,000	
경북	경주시	국보 제24호	경주 석굴암 석굴	경주 석굴암 석굴 관람환경 개선연구	210,000	90,000	300,000	●
경북	경주시	국보 제24호	경주 석굴암 석굴	경주 석굴암 석굴 보존처리	210,000	90,000	300,000	●
경북	경주시	국보 제24호	경주 석굴암 석굴	경주 석굴암 석굴 진입로 정비	350,000	150,000	500,000	
경북	경주시	국보 제24호	경주 석굴암 석굴	경주석굴암석굴주변정비	329,000	141,000	470,000	
경북	영주시	국보 제18호	영주 부석사 무량수전	영주부석사무량수전진입로정비(사전 설계)	21,000	9,000	30,000	
경북	영주시	국보 제18호	영주 부석사 무량수전	영주 부석사 자인당 소방도로 정비(사전설계)	35,000	15,000	50,000	
경북	영주시	국보 제18호	영주 부석사 무량수전	부석사 응진전 보수 및 주변정비사업	84,000	36,000	120,000	
경북	안동시	시도유형 제325호	봉정사 만세루	안동 봉정사 만세루 보수공사 설계용역	70,000	30,000	100,000	
경북	안동시	국보 제15호	안동 봉정사 극락전	보존처리(3D스캔,모사도작성,성분분석 등)	140,000	60,000	200,000	
경북	안동시	국보 제311호	안동 봉정사 대웅전	세계유산 봉정사 종합정비계획수립	35,000	15,000	50,000	
경남	합천군	국보 제52호	합천 해인사 대장경판	대장경판 보존을 위한 친환경관리시스템구축(2020)	245,000	105,000	350,000	
경남	합천군	국보 제52호	합천 해인사 대장경판	세계유산 VR컨텐츠 및 어트랙션 업데이트	38,500	16,500	55,000	

21. 국가지정문화재 현상변경 등 처리결과 보고

가. 보고사항

경북 영천시 소재 보물 「영천 신월리 삼층석탑」 주변 진입로 개설 공사 등 허가신청 19건에 대하여 자체검토회의 등을 거쳐 다음과 같이 처리하였음을 보고 드립니다.

나. 처리내용

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
소 계		19건	원안가결 15건 조건부가결 4건	
영천 신월리 삼층석탑	경북 영천 (○○○)	<input type="checkbox"/> 진입로 개설공사 ○ 위치 : 영천시 금호읍 신월리 205-1 * 제1,3구역(보호구역에서 330m 이격) ○ 사업내용 - 규모 : B=20.0m, L=335.5m - 토공 : 흙깎기 1,626m ³ , 흙쌓기 2,238m ³ , 터파기 2,241m ³ , 되메우기 1,686m ³ - 구조물공 : L형옹벽H=2.0~4.0m, L=147.5m - 포장공 : 아스팔트포장A=5,060m ² , 보도 포장A=1,730m ² , 측구공L=689m - 우수공 : 우수관(D400)L=653m, 수로암거 (1.0*1.0)L=20.5m, 우수맨홀 3개소, 우수받이 41개소, 집수정 2개소 - 오수공 : 오수관(D250)L=642m, 오수맨홀 16개소 - 상수도공 : 상수관(D80)L=682m	원안가결	'20.01.30

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
공주 마곡사 영산전	충남 공주 (○○○)	<input type="checkbox"/> 단독주택 진입로 개설 ○ 위치 : 공주시 사곡면 운암리 639 * 제2구역(보호구역에서 440m 이격) ○ 사업내용 - 부지면적 : 347㎡ - 콘크리트포장 T=20cm, 95㎡	원안가결	'20.01.30
안동 예안이씨 충효당, 안동 체화정	경북 안동 (○○○)	<input type="checkbox"/> 하천제방 사면보강 공사 ○ 위치 : 안동시 풍산읍 상리리,하리리 지내 * 제1구역(보호구역에서 110m 이격) ○ 사업내용 - 토공 : 흙깎기 4,045㎡, 흙쌓기 259㎡, 최고높이 3.6m - 구조물공 : 매트리스형 돌망태 5,409㎡, 최고높이 3.0m	원안가결	'20.01.30
성주 범수사지 삼층석탑	경북 성주 (○○○)	<input type="checkbox"/> 단독주택 신축(변경허가) ○ 위치 : 성주군 수륜면 백운리 974-1번지 외 1필지 * 제2구역(보호구역에서 350m 이격) * 시도유형문화재 「범수사지 당간지주」 보호구역에서 180m 이격 ○ 사업내용 : 단독주택 1동, 창고 2동 - 대지면적(사업면적) : 931㎡→957㎡ - 건축(연)면적 : 172.79㎡(3개동) · 주택-131.59㎡, 창고1-21.2㎡, 창고2-20㎡ - 층수/최고높이 : 2층/7.6m - 구조 : 철근콘크리트/경량철골구조 - L형옹벽 : H=2.0~5.0m, L=67m →자연석쌓기H=1.0~2.0m, L=22m - 전석쌓기 : H=0.8~3.6m, L=70m →H=0.6~4.0m, L=93m	원안가결	'20.01.30

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
영암 성풍사지 오층석탑	전남 영암 (○○○)	<input type="checkbox"/> 단독주택 신축(변경허가) <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 영암군 영암읍 춘향리 661번지 외 2필지 * 제1구역(보호구역에서 63m 이격) ○ 내용 : 단독주택 신축(1동) <ul style="list-style-type: none"> - 부지면적 : 당초(624㎡) ⇒ 변경(995㎡) - 건축면적 : 당초(99.43㎡) ⇒ 변경(160.88㎡) - 구조 : 철근콘크리트(변동없음) - 층수/최고높이 : 1층/5.15m(당초)→6.1m(변경) - 기타 : 편백나무 식재 7주 등 	원안가결	'20.01.30
여주 신록사 조사당	경기 여주 (○○○)	<input type="checkbox"/> 노유자시설(근로복지시설(증축)) 및 가설 건축물(임시창고, 김치저장고) 설치 <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 여주시 천송동 298-5번지 * 제1구역(보호구역에서 112m 이격) ○ 사업내용 : 건물 1동 증축, 가설건축물 2동 설치 <p><건축물></p> <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 6,531㎡(변동없음) - 건축면적 : 당초 1,128.96㎡→변경 1,156.3㎡ (증축 27.34㎡) <p>※ 증축건물</p> <ul style="list-style-type: none"> - 용도 : 프로그램실 - 층수/높이 : 지상1층/3.7m - 구조 : 경량철골구조 <p><가설건축물></p> <ul style="list-style-type: none"> - A동(임시창고) : 면적 65.7㎡/지상 1층 / 높이 2.9m - B동(김치저장고) : 면적 6.6㎡/지상 1층 / 높이 2.5m <p>※ 존치기간 - 허가일로부터 3년</p>	원안가결	'20.01.30

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
곡성 태안사 광자대사탑	전남 곡성 (○○○)	<input type="checkbox"/> 도로시설 (흙)포장 ○ 위치 : 곡성군 죽곡면 원달리 산18-1 일원 * 보호구역 및 제1구역(보호구역에서 5m 내) ○ 사업내용 : 흙콘크리트 포장(A=412m ²) - 1라인 : A=32m ² (L=5.7m, B=5.6m) - 2라인 : A=180m ² (L=46m, B=3.9m) - 3라인 : A=120m ² (L=20m, B=6m) - 4라인 : A=80m ² (L=11.5m, B=7m)	원안가결	'20.01.30
산청 단속사지 동 삼층석탑	경남 산청 (○○○)	<input type="checkbox"/> 단독주택 주변 수목제거(변경허가) ○ 위치 : 산청군 단성면 윤리 산 45-22번지 내 * 제1구역(보호구역에서 360m 이격) ○ 사업내용 : 주변 수목제거 추가(330m ²) - 소나무 30여주, 참나무 10여주	원안가결	'20.01.30
논산 쌍계사 대웅전	충남 논산 (○○○)	<input type="checkbox"/> 임도, 숲길정비, 숲가꾸기사업 ○ 위치 : 논산시 양촌면 중산리 산13번지 일원 * 제1구역(보호구역에서 30m 이격) ○ 사업내용 - 숲가꾸기(26.8ha) · 숲아베기 : ha당 제거본수 400본(제거율 본수대비 약 27%) · 산물수집 : 수집면적 15.2ha, 총수집량 280.24m ³	원안가결	'20.02.11

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
대구 동화사 대웅전	대구 동구 (○○○)	<input type="checkbox"/> 부도암 수선당 개축공사 ○ 위치 : 동구 도학동 9번지 * 제1구역(보호구역에서 410m 이격) ○ 사업내용 - 대지면적 : 3,702㎡ - 건축(연)면적 : 140.01㎡ - 구조 : 한식목구조 - 층수/높이 : 지상1층/6.24m * 수선당 철거 - 건축(연)면적 : 207.68㎡ - 구조 : 한식목구조+콘크리트조적조 - 층수 : 지상1층	원안가결	'20.02.11
부여 무량사 극락전	충남 부여 (○○○)	<input type="checkbox"/> 수목정비 ○ 위치 : 부여군 외산면 무량로 203 * 보호구역 내, 제1구역 ○ 사업내용 - 극락전 후면 구간 : 참나무 8주 (H15XR70 : 1주, H15XR60 : 4주, H15XR50 : 2주, H15XR40 : 1주) - 범종각 주변 구간 : 느티나무 2주 (H15XR60 : 2주)	원안가결	'20.02.11
성주 금봉리 석조비로자나 불좌상	경북 성주 (○○○)	<input type="checkbox"/> 단독주택 신축 ○ 위치 : 성주군 가천면 금봉리 269, 270번지 * 제1,2구역(보호구역에서 100m 이격) ○ 사업내용 - 대지면적 : 666㎡ - 건축(연)면적 : 117.81㎡(110.16㎡) - 층수/최고높이 : 1층/5.4m - 구조 : 조적구조	원안가결	'20.02.11

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
예산 수덕사 대웅전	충남 예산 (○○○)	<input type="checkbox"/> 후원 증축(변경허가) ○ 위치 : 예산군 덕산면 사천리 19 * 보호구역 내 ○ 사업내용 - 연면적 : 94.69㎡→106.15㎡(11.46㎡증) - 구조 : 철근콘크리트구조 - 증축부분의 기존 화강석 기단 철거 후, 한식목구조 설치 - 기존 목재기둥, 차양 및 외부 화장실 철거 후 증축 * 면적 및 평면 등 변경	원안가결	'20.02.11
부안 개암사 대웅전	전북 부안 (○○○)	<input type="checkbox"/> 주차장 조성 ○ 위치 : 부안군 상서면 감교리 721-1번지 일원 * 보호구역 내 ○ 사업내용 : 주차대수 56대(일반형 40, 대형 4, 장애인 5, 여성우대 7) - 사업면적 : 3,985㎡ - 토공 : 절토 1,409㎡, 성토 79㎡ - 배수공 : 벤치플룸관(600*600mm) L=128m 흙관(D600mm) L=4m - 포장공 : 잔디블록 2,745㎡, 점토블록 269㎡ - 구조물공 : 자연석쌓기 207㎡	원안가결	'20.02.11
제주 불탑사 오층석탑	제주 제주 (○○○)	<input type="checkbox"/> 버섯재배시설 및 웅스 설치 ○ 위치 : 제주시 삼양1동 677번지 * 제1구역(보호구역에서 135m 이격) ○ 사업내용 - 대지면적 : 3,342㎡ - 비닐하우스(16.5m*26m*4.5h) 1동 설치 - 버섯 자연건조대(1.5m*10m*2h) 1개소 설치 - 경계 웅스 설치(H=2.5m) : L=70m	원안가결	'20.02.11

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
공주 마곡사 대광보전	충남 공주 (○○○)	<input type="checkbox"/> 기존 계단 철거 후 계단 설치(2차) ○ 위치 : 공주시 사곡면 운암리 산72-3, 568-1번지 * 제1구역(보호구역에서 286m 이격) ○ 사업내용 - 사업면적 : 54㎡ - 계단 : L=22m, B=2m - 거친돌(자연돌)쌓기 : H=1.1~0.2m, L=44m - 목재난간 : H=1.1m, L=44m	조건부가결 (- 경사로 폭을 1.6~1.8m 로 축소 조정 - 경사로 측면의 석축은 최대 0.7m 이내로 함 - 난간의 모양을 좀 더 단순한 형태로 조정(높이 1.1m, 난간대 3단)	‘20.01.30
보성 유신리 마애여래좌상	전남 보성 (○○○)	<input type="checkbox"/> 종각 건립 ○ 위치 : 보성군 읍어면 유신길 195 * 제1구역(보호구역에서 124m 이격) ○ 사업내용 : 종각 건립 - 바닥면적 : 45.36㎡ - 구조 : 한식목구조 - 주칸 : 정면3칸, 측면2칸 - 양식 : 1출목 2익공양식 - 지붕 : 팔작지붕 - 최고높이 : 9.285m	조건부가결 (관계전문 가 자문을 받아 시행)	‘20.02.11

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
홍성 신경리 마애여래입상	충남 홍성 (○○○)	<input type="checkbox"/> 임시공양간 설치 ○ 위치 : 홍성군 홍북읍 신경리 510-24 * 제1구역(보호구역에서 80m 이격) ○ 사업내용 - 건축(연)면적 : 77.96㎡ - 구조 : 경량철골구조 - 층수/높이 : 지상1층/4.5m	조건부가결 (공양간 준공 후 임시공양간 철거)	'20.02.11
익산 고도리 석조여래입상	전북 익산 (○○○)	<input type="checkbox"/> 주차장 부지 조성 ○ 위치 : 익산시 덕기동 167-3, 172-19번지 * 제4구역(보호구역에서 420m 이격) ○ 사업내용 - 주차장 면적 : 6,430㎡ - 진입도로 면적 : 41㎡ - 기타 : 우수관(D300) L=157m, 오수맨홀(600*600) 7개소, 상록수식재(H=1m) 140주 등	조건부가결 (관계전문 가 자문을 받아 시행)	'20.02.11

다. 의결사항

- 원안접수
- 의결정족사항
 - 출석 9명 / 원안접수 9명
